

AUTOCONTROLE PAR ESSAIS D' ETANCHEITE DES RESEAUX D' ASSAINISSEMENT EU

Client	: COLAS LES SABLES D OLLONNE ZI DES PLESSSES COL8503 14 RUE LOUIS DE LAGRANGE 85180 CHATEAU D OLLONNE			
Chantier	: Complexe Sportif BOIS DE CENE			
Référence du dossier	: C-0215-2025			
Dates d'essai d'étanchéité	12/03/2025			
Sections testées en étanchéités :	Quantité	Conforme	Non Conforme	Abandonné
Tronçons	4	4	0	0
Branchement	0	0	0	0
Regard	0	0	0	0


Entreprise Guy CHALLANCIN
24, rue du Chêne Lassé
B.P. 50393
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tel : 02-40-471-471 Fax : 02-40-048-374

A. CESBRON



Rédacteur

AT. PHAN



Vérificateur / Approbateur



Entreprise Guy CHALLANCIN

24, rue du Chêne Lassé
B.P. 50393
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tel : 02-40-471-471 Fax : 02-40-048-374

**AUTOCONTROLE PAR
ESSAIS D' ETANCHEITE DES
RESEAUX D'
ASSAINISSEMENT EU**

SOMMAIRE

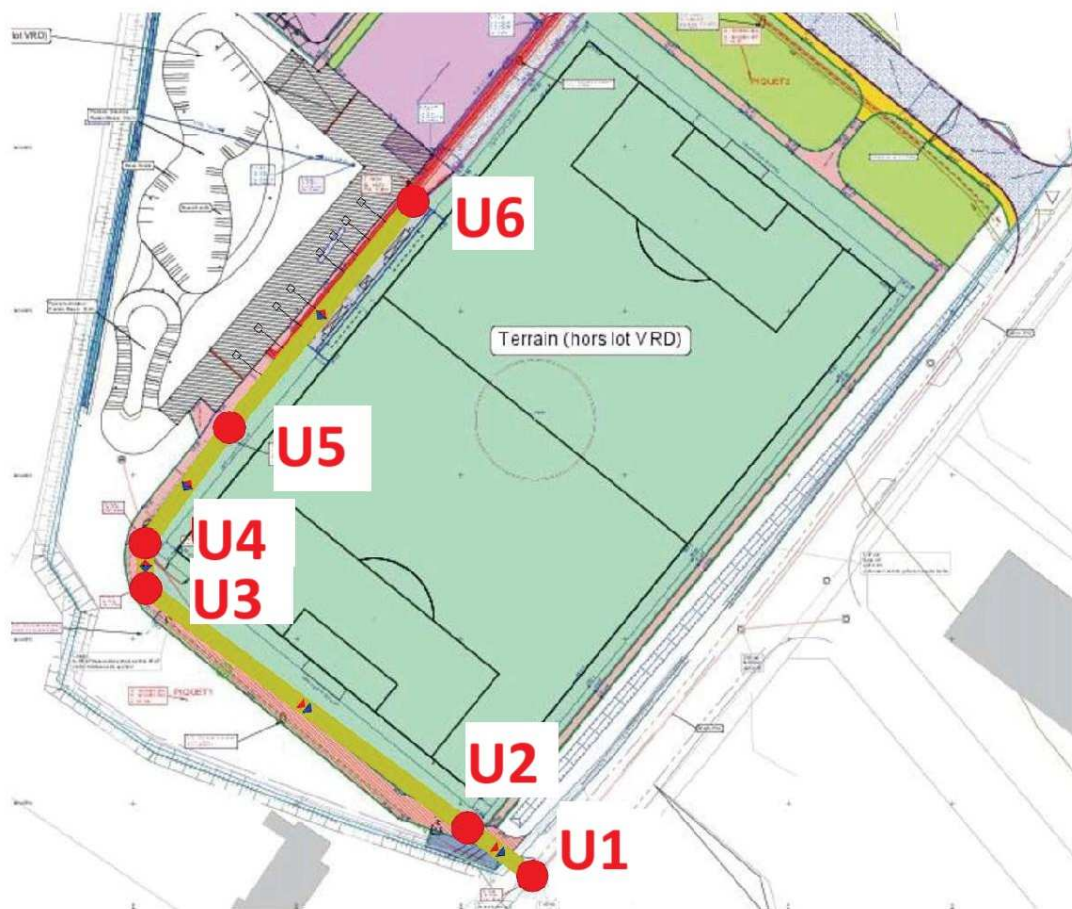
PLAN EU	3
Essai d'étanchéité EU1 - EU2	4
Essai d'étanchéité EU2 - EU3	5
Essai d'étanchéité EU3 - EU4	6
Essai d'étanchéité EU4 - EU5	7
Synthèse d'essai d'étanchéité	8

Client : COLAS LES SABLES D OLONNE
Chantier : Complexe Sportif
BOIS DE CENE

Référence du dossier : C-0215-2025

N° de Page : 2 / 8

PLAN EU



**Entreprise Guy CHALLANCIN**

24, rue du Chêne Lassé
B.P. 50393
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tel : 02-40-471-471 Fax : 02-40-048-374

**AUTOCONTROLE PAR
ESSAIS D' ETANCHEITE DES
RESEAUX D'
ASSAINISSEMENT EU****ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ EU1 - EU2**

Référence du dossier : C-0215-2025
Nom de l'inspecteur :
Emplacement : Complexe Sportif
Ville ou village : BOIS DE CENE
Maître d'ouvrage :
Maître d'oeuvre :
Entreprise canalisatrice : COLAS

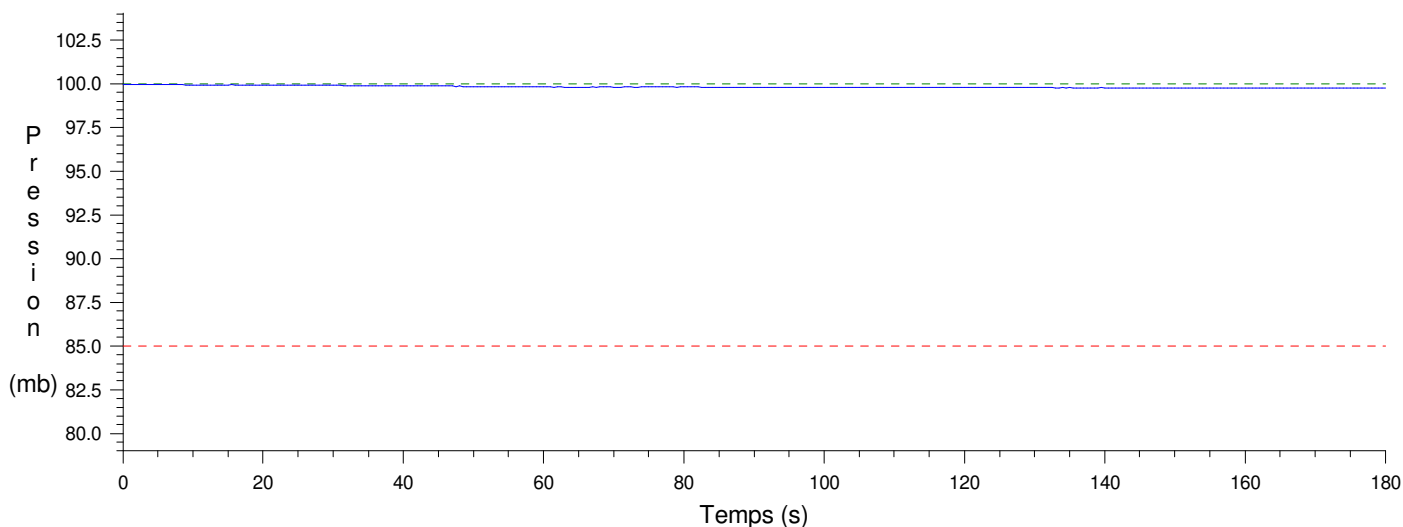
Appareil de contrôle : Sirocco V2.04 NS43 Capteur 222127
Etalonnage de l'appareil : 14/10/2024
Référence de la section : EU1 - EU2
Date de l'essai : 12/03/2025
Heure de l'essai : 15:40:26
Imprégnation : Sans

Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux usées uniquement
Dimension : Ø200mm
Matériaux : PVC-U
Longueur du tronçon : 11.00 ml
Longueur éprouvée : 11.00 ml
Météorologie : Pas de précipitations
Conditions d'écoulement : Aucune mesure prise
Etat du remblai : Remblai terminé
Etat de la voirie : Forme terminée
Type d'emplacement : Sous une route
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Hauteur de la nappe :

Protocole : NF EN1610:2015 LC (air)
Pression de l'essai (mb) : 100.0 mb
Pression minimum autorisé (mb) : 85.0 mb
Pression finale de l'essai (mb) : 99.7 mb

Durée saturation de l'essai (s) : 40 s
Durée établie de l'essai (s) : 180 s
Durée effective de l'essai (s) : 180 s

Remarques particulières :

Résultat Conforme

Client : COLAS LES SABLES D OLLONNE
Chantier : Complexe Sportif
BOIS DE CENE

Référence du dossier : C-0215-2025

N° de Page : 4 / 8

**Entreprise Guy CHALLANCIN**

24, rue du Chêne Lassé
B.P. 50393
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tel : 02-40-471-471 Fax : 02-40-048-374

**AUTOCONTROLE PAR
ESSAIS D' ETANCHEITE DES
RESEAUX D'
ASSAINISSEMENT EU****ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ EU2 - EU3**

Référence du dossier : C-0215-2025
Nom de l'inspecteur :
Emplacement : Complexe Sportif
Ville ou village : BOIS DE CENE
Maître d'ouvrage :
Maître d'oeuvre :
Entreprise canalisatrice : COLAS

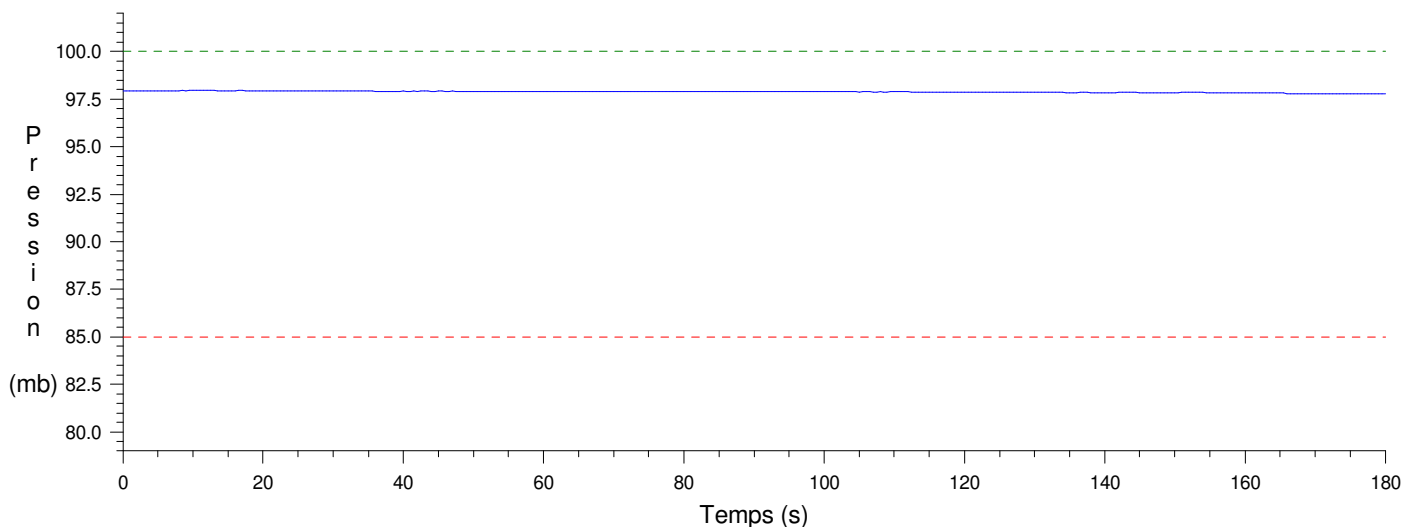
Appareil de contrôle : Sirocco V2.04 NS43 Capteur 222127
Etalonnage de l'appareil : 14/10/2024
Référence de la section : EU2 - EU3
Date de l'essai : 12/03/2025
Heure de l'essai : 15:49:46
Imprégnation : Sans

Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux usées uniquement
Dimension : Ø200mm
Matériaux : PVC-U
Longueur du tronçon : 65.00 ml
Longueur éprouvée : 65.00 ml
Météorologie : Pas de précipitations
Conditions d'écoulement : Aucune mesure prise
Etat du remblai : Remblai terminé
Etat de la voirie : Forme terminée
Type d'emplacement : Sous une route
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Hauteur de la nappe :

Protocole : NF EN1610:2015 LC (air)
Pression de l'essai (mb) : 100.0 mb
Pression minimum autorisé (mb) : 85.0 mb
Pression finale de l'essai (mb) : 97.8 mb

Durée saturation de l'essai (s) : 40 s
Durée établie de l'essai (s) : 180 s
Durée effective de l'essai (s) : 180 s

Remarques particulières :

Résultat Conforme

Client : COLAS LES SABLES D OLLONNE
Chantier : Complexe Sportif
BOIS DE CENE

Référence du dossier : C-0215-2025

N° de Page : 5 / 8

**Entreprise Guy CHALLANCIN**

24, rue du Chêne Lassé

B.P. 50393

44819 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tel : 02-40-471-471 Fax : 02-40-048-374

**AUTOCONTROLE PAR
ESSAIS D' ETANCHEITE DES
RESEAUX D'
ASSAINISSEMENT EU****ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ EU3 - EU4**

Référence du dossier : C-0215-2025
Nom de l'inspecteur :
Emplacement : Complexe Sportif
Ville ou village : BOIS DE CENE
Maître d'ouvrage :
Maître d'oeuvre :
Entreprise canalisatrice : COLAS

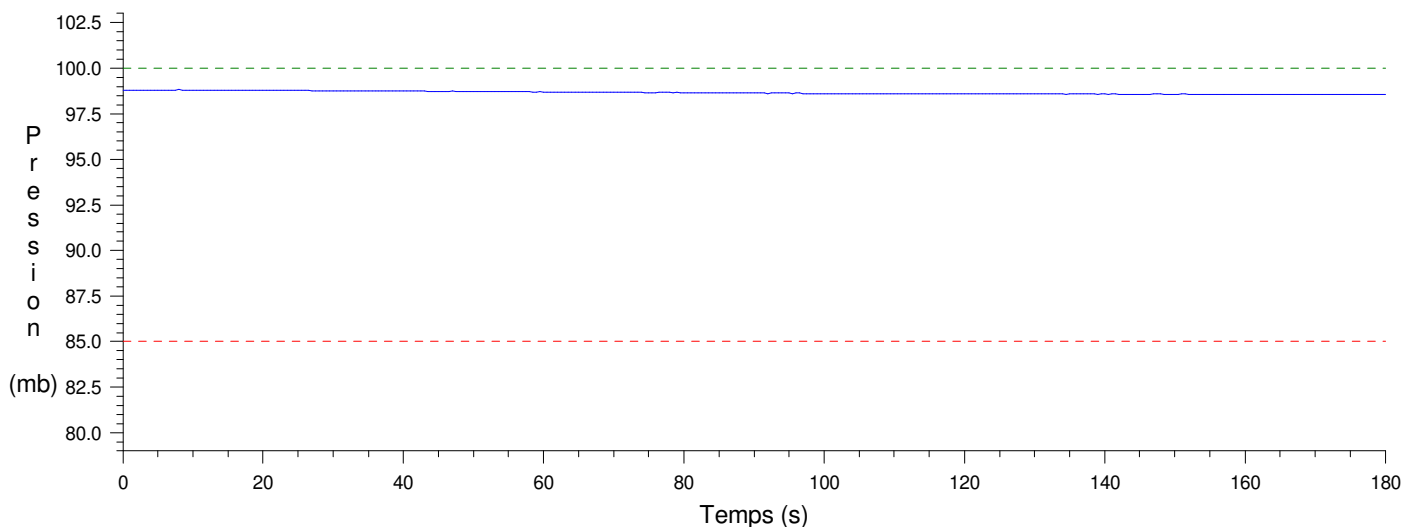
Appareil de contrôle : Sirocco V2.04 NS43 Capteur 222127
Etalonnage de l'appareil : 14/10/2024
Référence de la section : EU3 - EU4
Date de l'essai : 12/03/2025
Heure de l'essai : 16:04:57
Imprégnation : Sans

Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux usées uniquement
Dimension : Ø200mm
Matériaux : PVC-U
Longueur du tronçon : 5.50 ml
Longueur éprouvée : 5.50 ml
Météorologie : Pas de précipitations
Conditions d'écoulement : Aucune mesure prise
Etat du remblai : Remblai terminé
Etat de la voirie : Forme terminée
Type d'emplacement : Sous une route
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Hauteur de la nappe :

Protocole : NF EN1610:2015 LC (air)
Pression de l'essai (mb) : 100.0 mb
Pression minimum autorisé (mb) : 85.0 mb
Pression finale de l'essai (mb) : 98.5 mb

Durée saturation de l'essai (s) : 40 s
Durée établie de l'essai (s) : 180 s
Durée effective de l'essai (s) : 180 s

Remarques particulières :

Résultat Conforme

Client : COLAS LES SABLES D OLLONNE
Chantier : Complexe Sportif
BOIS DE CENE

Référence du dossier : C-0215-2025

N° de Page : 6 / 8

**Entreprise Guy CHALLANCIN**

24, rue du Chêne Lassé
B.P. 50393
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tel : 02-40-471-471 Fax : 02-40-048-374

**AUTOCONTROLE PAR
ESSAIS D' ETANCHEITE DES
RESEAUX D'
ASSAINISSEMENT EU****ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ EU4 - EU5**

Référence du dossier : C-0215-2025
Nom de l'inspecteur :
Emplacement : Complexe Sportif
Ville ou village : BOIS DE CENE
Maître d'ouvrage :
Maître d'oeuvre :
Entreprise canalisatrice : COLAS

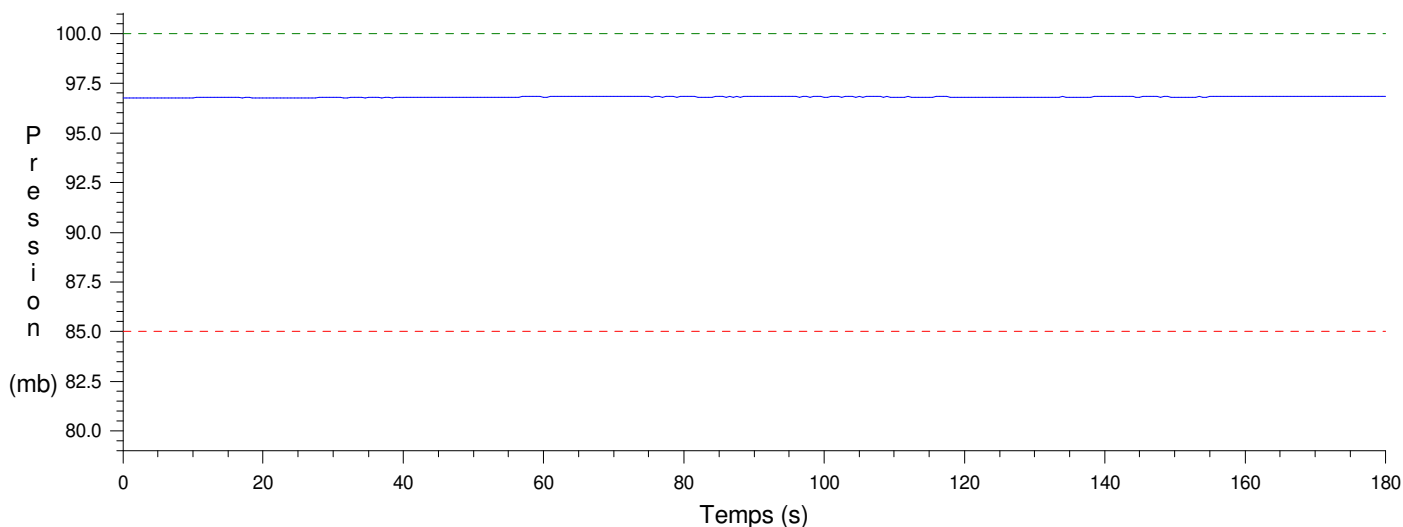
Appareil de contrôle : Sirocco V2.04 NS43 Capteur 222127
Etalonnage de l'appareil : 14/10/2024
Référence de la section : EU4 - EU5
Date de l'essai : 12/03/2025
Heure de l'essai : 16:10:20
Imprégnation : Sans

Utilisation du collecteur : Collecteur d'eaux usées uniquement
Dimension : Ø200mm
Matériaux : PVC-U
Longueur du tronçon : 22.00 ml
Longueur éprouvée : 22.00 ml
Météorologie : Pas de précipitations
Conditions d'écoulement : Aucune mesure prise
Etat du remblai : Remblai terminé
Etat de la voirie : Forme terminée
Type d'emplacement : Sous une route
Ouvrage sous nappe : Ne sait pas
Hauteur de la nappe :

Protocole : NF EN1610:2015 LC (air)
Pression de l'essai (mb) : 100.0 mb
Pression minimum autorisé (mb) : 85.0 mb
Pression finale de l'essai (mb) : 96.8 mb

Durée saturation de l'essai (s) : 40 s
Durée établie de l'essai (s) : 180 s
Durée effective de l'essai (s) : 180 s


Remarques particulières :

Résultat Conforme

Client : COLAS LES SABLES D OLLONNE
Chantier : Complexe Sportif
BOIS DE CENE

Référence du dossier : C-0215-2025

N° de Page : 7 / 8



AUTOCONTROLE PAR ESSAIS D' ETANCHEITE DES RESEAUX D' ASSAINISSEMENT EU

Référence de la section	Dimension	Longueur Profondeur	Branchement			Protocole	Résultat
			Nombre	Dimension	Longueur		
EU1 - EU2	Ø200mm	11.00ml				100 mb - 85 mb	C
EU2 - EU3	Ø200mm	65.00ml				100 mb - 85 mb	C
EU3 - EU4	Ø200mm	5.50ml				100 mb - 85 mb	C
EU4 - EU5	Ø200mm	22.00ml				100 mb - 85 mb	C

NR : Non réalisé NCA : Non Conforme Abandon NC : Non Conforme C : Conforme

Client : COLAS LES SABLES D OLLONE
Chantier : Complexe Sportif
BOIS DE CENE

Référence du dossier : C-0215-2025

N° de Page : 8 / 8
