DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	**POVOFOR**
Client:	**GAEC PENFRA** PENFRA 56490 ST MALO DES TROIS FONTAINES
Maître d'oeuvre:	**IGEFOR** 35580 GUIGNEN
Exploitant:	35580 GUIGNEN

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : PENFRA
56490 ST MALO DES TROIS FONTAINES

Coordonnées : **Longitude** 293 072 **Latitude** 6 781 991 ***Altitude :*** 71.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/02/2026 ***Resp. M. Ouvrage :***

Date fin de l'ouvrage : 22/03/2026 ***Resp. M. Oeuvre :***

Machine : ***Resp. Chantier :***

Date début pompage : ***Niveau statique non perturbé :*** 0.00 m

Date fin de pompage : ***Débit Maxi. d'essai :*** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : ***Rabattement correspondant :*** 0.00 m

---

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	**GAEC PENFRA**
Maître d'oeuvre:	**IGEFOR**
Lieu de l'ouvrage :	**PENFRA**
	56490 **ST MALO DES TROIS FONTAINES**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	7.00	Altération du substratum
7.00	100.00	Protérozoïque terminal à Paléozoïque basal. Briovérien. Faciès type 1 ("Dalles de Néant"). Alternances silto-gréseuses

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

** Reconnaissance*

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	90.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
90.00	100.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

FORAGE D'EAU

Client : GAEC PENFRA
Maitre d'oeuvre : IGEFOR
Localisation de l'ouvrage : PENFRA
56490 ST MALO DES TROIS FONTAINES

Travaux réalisés : 1\1
du : 22/02/2026 au : 22/03/2026

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 293 072
Latitude (Y): 6 781 991
Altitude sol (Z): +71.000 m

Echelle : 1/503 — Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) — Nombre de forages : 1

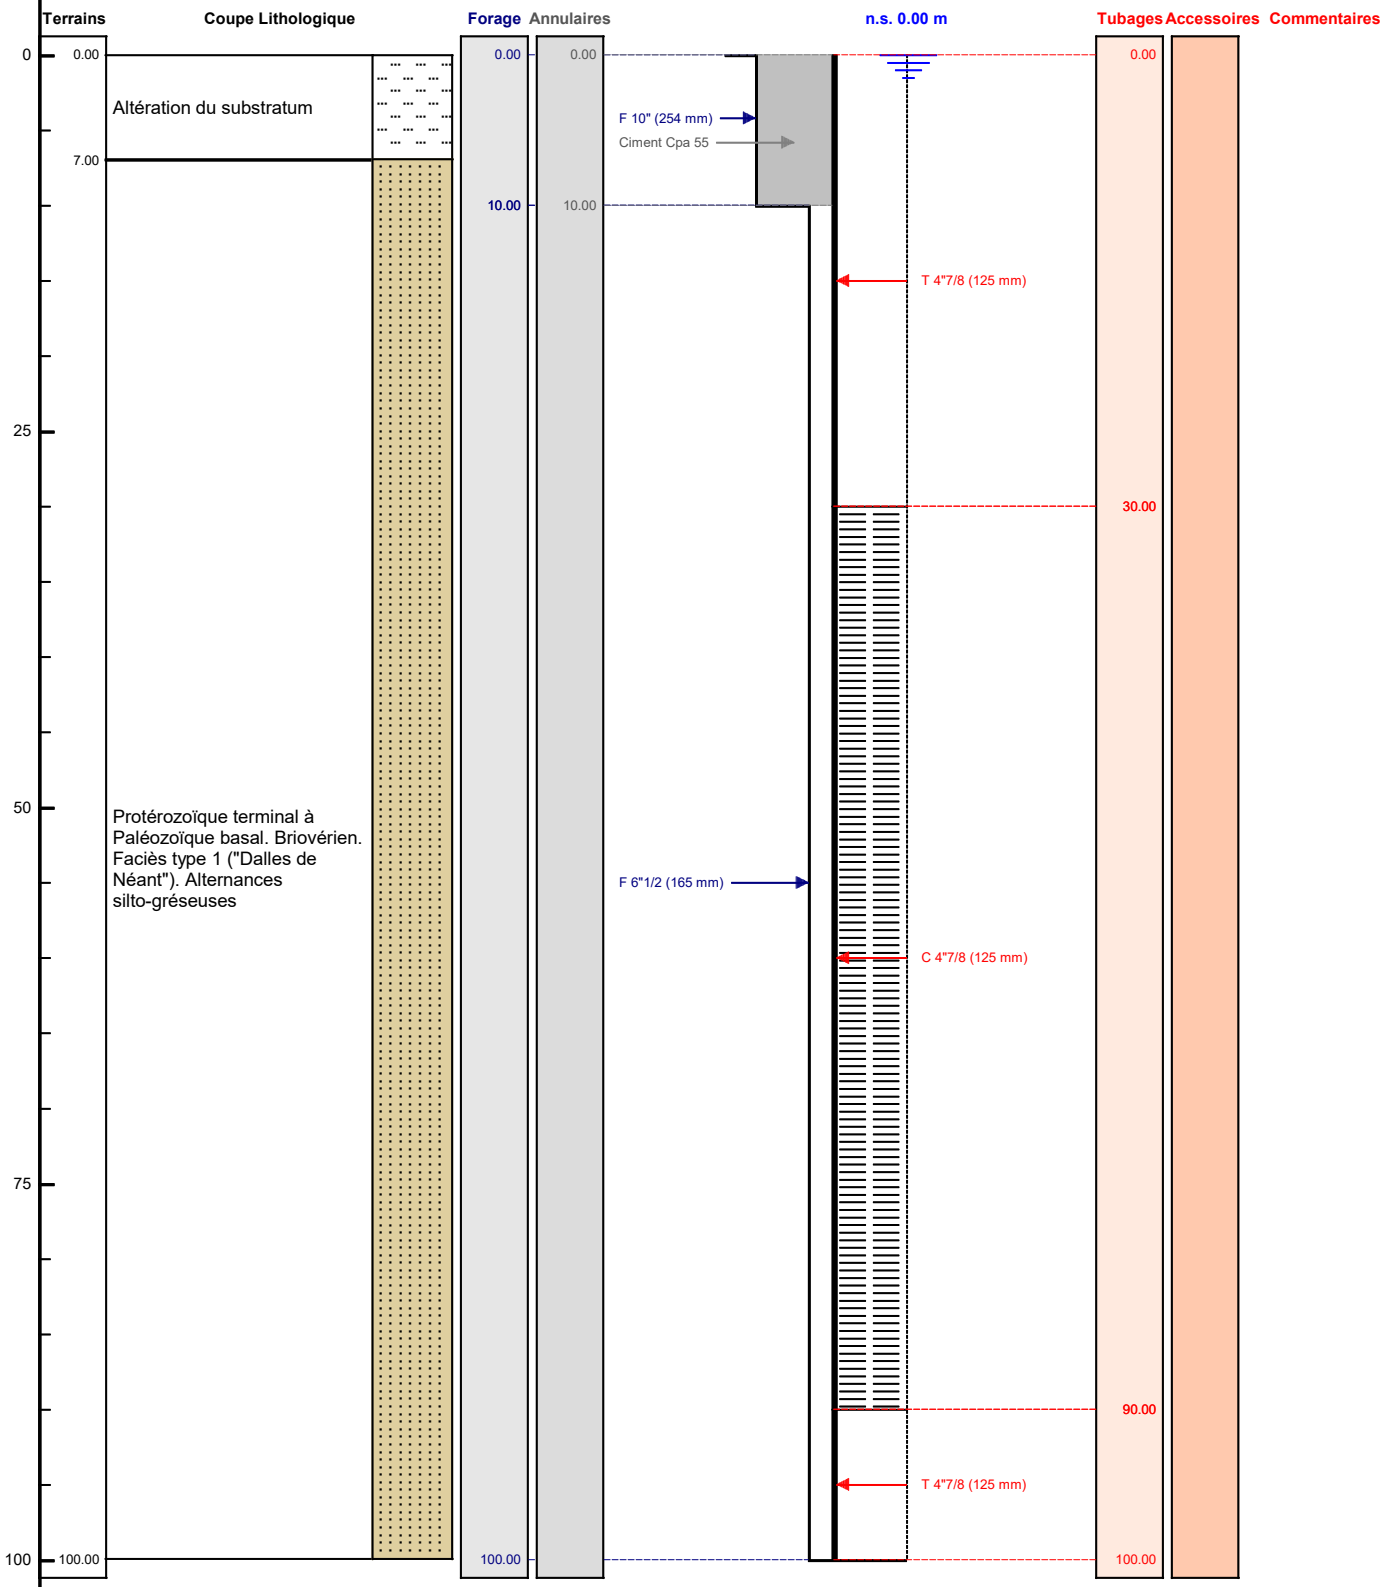

Le ...../...../..... à .....
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
