LYON 07 CROUS Debourg

Proposition de calendrier du 19/12/2024

BOUYGUES BATIMENT
SUD-EST

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**PHASE CONCOURS / APPEL D'OFFRE**	**42 jrs**	**Mar 01/10/24**
2	Remise offre finale	0 jr	Mar 01/10/24
5	Notification du marché	0 jr	Lun 02/12/24
6	**AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES**	**231 jrs**	**Lun 02/12/24**
7	**Permis de construire**	**217 jrs**	**Lun 23/12/24**
8	Mise au point dossier PC	35 jrs	Lun 23/12/24
9	Validation dossier PC	20 jrs	Mer 19/02/25
10	Dépôt du PC	0 jr	Mar 18/03/25
11	Complétude du PC	1 mé	Mar 18/03/25
12	Instruction du PC	5 mé	Jeu 17/04/25
13	Obtention du PC	0 jr	Dim 14/09/25
14	Affichage du PC avec constat d'huissier	0 jr	Lun 15/09/25
15	Délai de recours des tiers	2 mé	Lun 15/09/25
16	Délai de retrait administratif	3 mé	Lun 15/09/25
17	**Permis de démolir**	**153 jrs**	**Lun 02/12/24**
18	Mise au point dossier PD	7 jrs	Lun 02/12/24
19	Validation dossier PD	20 jrs	Mer 11/12/24
20	Finalisation étude cas par cas	35 jrs	Jeu 09/01/25
21	Dépôt du PD	0 jr	Mer 26/02/25
22	Complétude du PD	5 jrs	Jeu 27/02/25
23	Instruction du PD	2 mé	Mer 05/03/25
24	Obtention du PD	0 jr	Dim 04/05/25
25	Délai de recours des tiers	2 mé	Dim 04/05/25
26	Délai de retrait administratif	3 mé	Dim 04/05/25
34	**PHASE CONCEPTION**	**150 jrs**	**Lun 02/12/24**
35	Mise au point dossier APD	40 jrs	Lun 02/12/24
36	Diffusion dossier APD	0 jr	Mar 04/02/25
37	Validation dossier APD	20 jrs	Mer 05/02/25
38	Mise au point dossier PRO	50 jrs	Mer 05/03/25
39	Diffusion dossier PRO v.0	0 jr	Ven 16/05/25
40	Validation dossier PRO v.0	20 jrs	Lun 19/05/25
41	Diffusion dossier PRO v.1	20 jrs	Jeu 19/06/25
71	**ETUDES D'EXECUTION**	**328 jrs**	**Mer 05/03/25**
72	**Amiante**	**65 jrs**	**Mer 05/03/25**
74	**Plan de retrait**	**45 jrs**	**Mer 02/04/25**
75	Rédaction plan de retrait	25 jrs	Mer 02/04/25
76	Instruction du plan de retrait	20 jrs	Lun 12/05/25
81	**Consultations et Etudes MEXT - Bardage // Prototype**	**180 jrs**	**Jeu 27/03/25**
87	**Prototype**	**55 jrs**	**Lun 04/08/25**
88	Approvisionnement prototype	30 jrs	Lun 04/08/25
89	Mise en oeuvre prototype	10 jrs	Lun 29/09/25
90	Présentation prototype façade	0 jr	Lun 13/10/25
91	Validation prototype façade	15 jrs	Lun 13/10/25
92	Appro / fabrication éléments de façades	40 jrs	Lun 03/11/25
94	**Etudes Structure Bois et béton + fabrication FOB**	**226 jrs**	**Ven 16/05/25**
171	Fin fabrication 1er niveau	0 jr	Jeu 05/02/26
182	**Témoins - délocalisé en dehors du bâtiment neuf**	**191 jrs**	**Jeu 19/06/25**
185	Présentation des échantillons	0 jr	Jeu 23/10/25
186	Validation des échantillons	15 jrs	Ven 24/10/25
188	Mise à dispo zone	0 jr	Jeu 08/01/26
189	1er de série SdB préfa	0 jr	Mar 06/01/26
190	Mise en oeuvre du témoin	40 jrs	Ven 09/01/26
191	Présentation du témoin	0 jr	Jeu 05/03/26
192	Validation du témoin	15 jrs	Ven 06/03/26

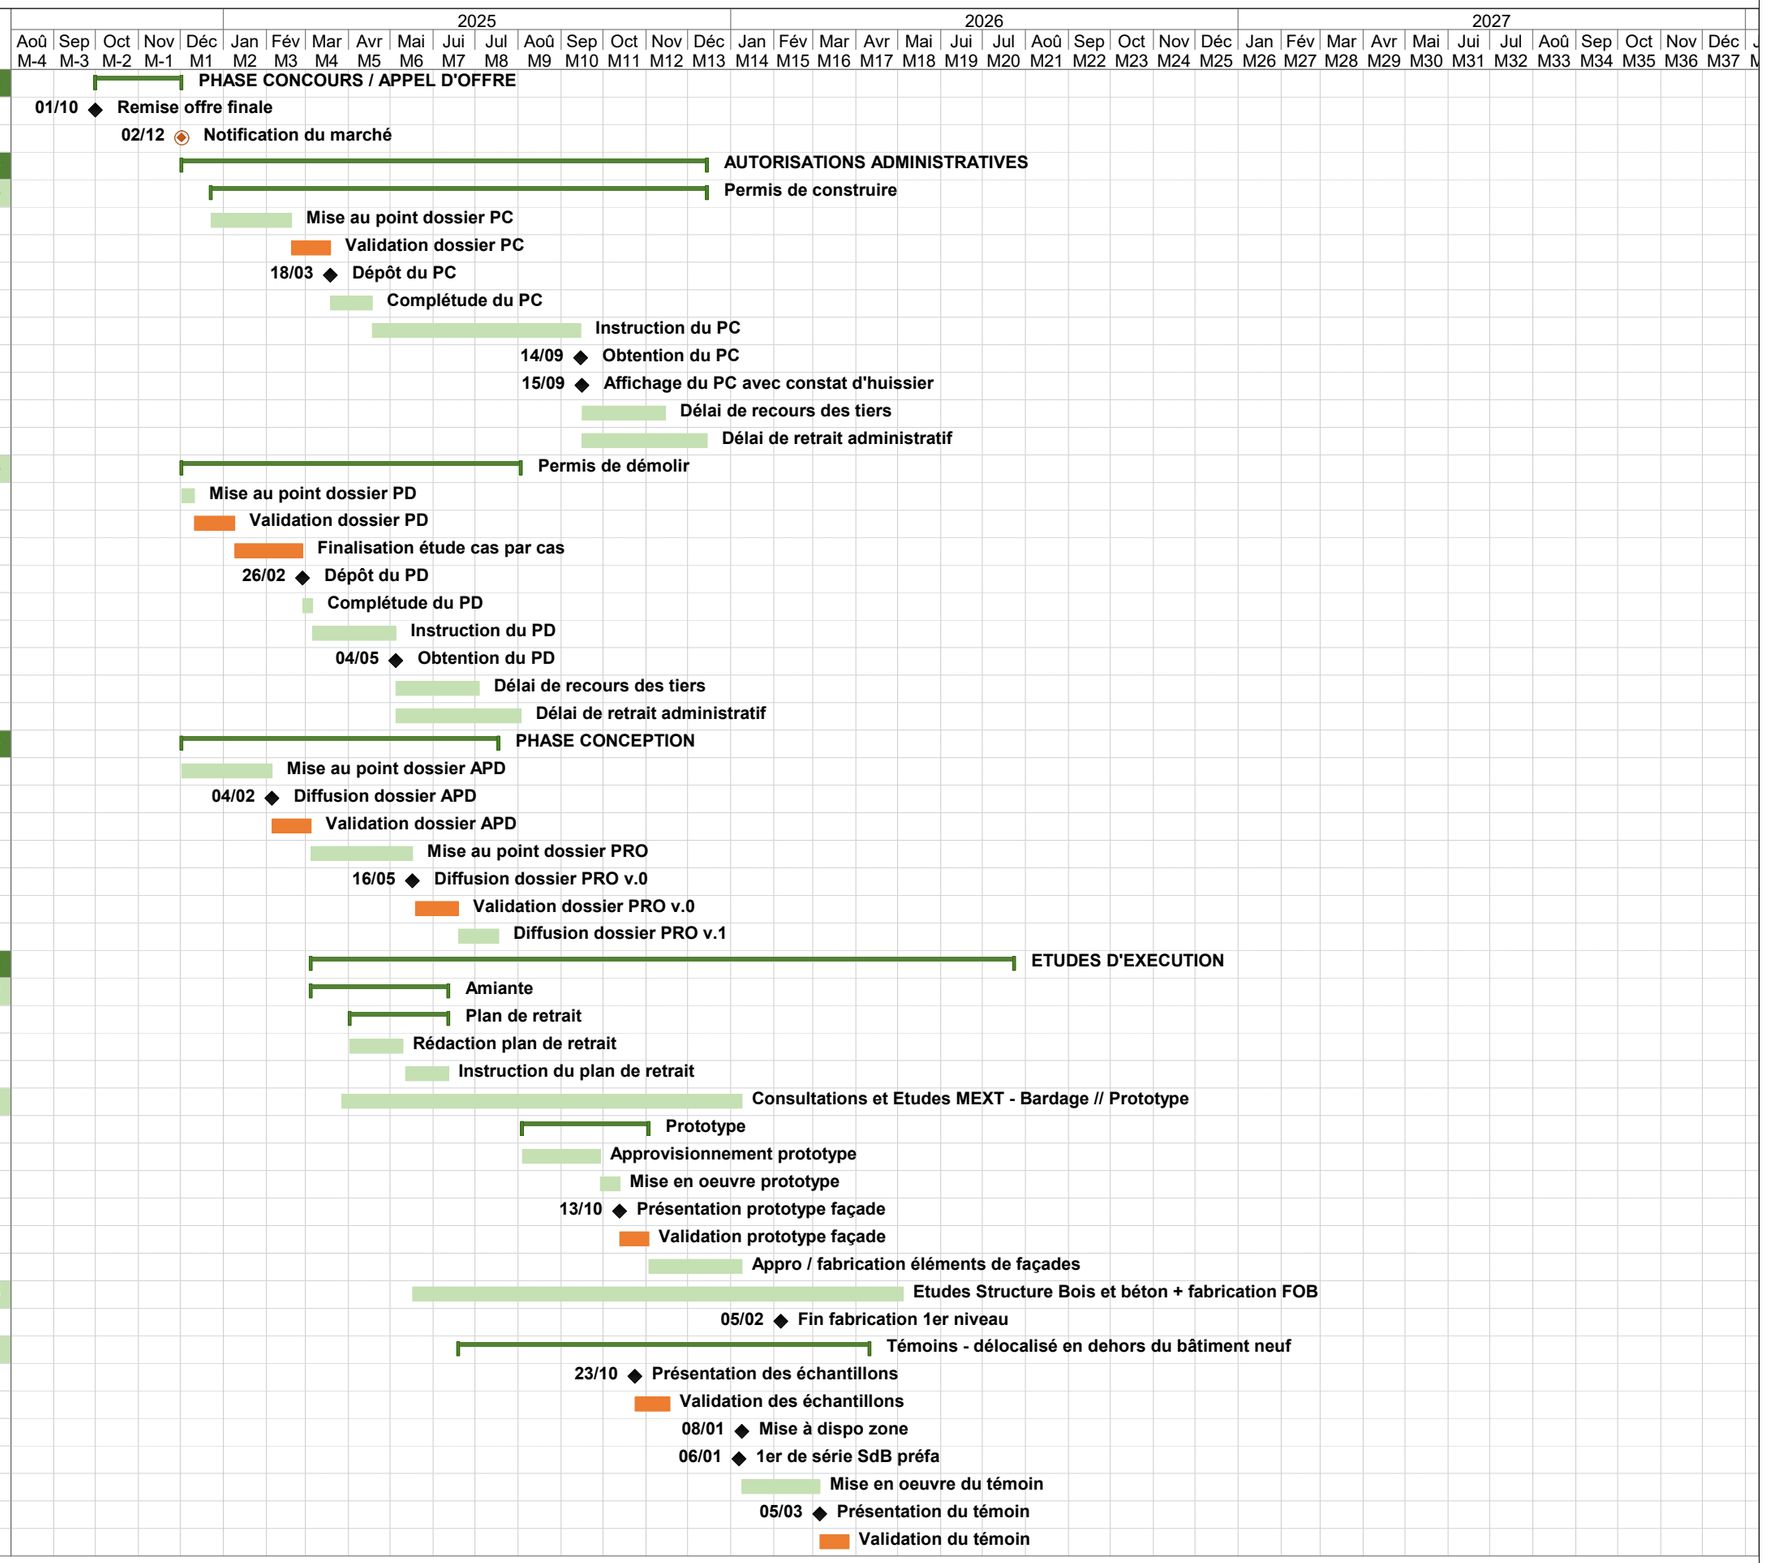

PDE

LYON 07 CROUS Debourg

Proposition de calendrier du 19/12/2024

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
199	**Consultation, études et fabrication salles de bain préfa**	**278 jrs**	**Lun 19/05/25**
215	Début R+1	0 jr	Ven 24/07/26
1348	**PREPARATION DE CHANTIER**	**155 jrs**	**Lun 23/06/25**
1349	OS travaux préparatoires	0 jr	Lun 23/06/25
1350	**Installation de chantier**	**12 jrs**	**Lun 23/06/25**
1357	Curage/désamiantage	23 jrs	Lun 25/08/25
1358	**Démolition**	**98 jrs**	**Jeu 25/09/25**
1365	**PHASE TRAVAUX**	**462 jrs**	**Lun 22/09/25**
1366	Rappel délai planning offre finale	**386 jrs**	**Lun 22/09/25**
1369	Levée de réserves	20 jrs	Mar 08/06/27
1370	OS travaux	0 jr	Ven 14/11/25
1371	Terrassements généraux / Substitution Remblais contre voiles	50 jrs	Lun 12/01/26
1372	**GO - (2 grues)**	**231 jrs**	**Lun 02/02/26**
1373	**Pieux et terrassements complémentaires**	**50 jrs**	**Lun 02/02/26**
1376	**GRUE G2**	**181 jrs**	**Mar 21/04/26**
1377	Grue Opérationnelle	1 jr	Mar 21/04/26
1378	**Fondations**	**60 jrs**	**Mar 21/04/26**
1383	**SOUS SOL CONTRE GYMNASE**	**28 jrs**	**Mar 23/06/26**
1387	**RdC - HT 550 -**	**35 jrs**	**Lun 20/07/26**
1390	**LOGEMENTS - 2 Bâtiments - B et A**	**100 jrs**	**Ven 04/09/26**
1421	**GRUE G1**	**175 jrs**	**Lun 02/03/26**
1422	Grue Opérationnelle	1 jr	Lun 02/03/26
1423	**Fondations**	**36 jrs**	**Lun 30/03/26**
1428	**GYMNASE SOUS SOL**	**28 jrs**	**Mar 12/05/26**
1432	**LOGEMENTS - 1 bâtiment - A**	**99 jrs**	**Mer 24/06/26**
1466	**Halle Sportive**	**101 jrs**	**Mer 24/06/26**
1467	**Clos et couvert**	**100 jrs**	**Mer 24/06/26**
1468	**Charpente/couverture**	**75 jrs**	**Mer 24/06/26**
1473	**Façades**	**50 jrs**	**Ven 18/09/26**
1478	**Bâtiments de logements**	**211 jrs**	**Jeu 06/08/26**
1479	**Clos et couvert**	**106 jrs**	**Lun 07/09/26**
1480	**Etanchéité**	**96 jrs**	**Lun 07/09/26**
1490	**Façades**	**40 jrs**	**Mer 16/12/26**
1494	**Corps d'états secondaires**	**221 jrs**	**Jeu 06/08/26**
1495	**Bâtiment C**	**165 jrs**	**Jeu 06/08/26**
1496	**Réseaux CET**	**88 jrs**	**Jeu 06/08/26**
1507	**Séquences CES intérieurs**	**153 jrs**	**Lun 07/09/26**
1525	**Bâtiment B**	**170 jrs**	**Mar 06/10/26**
1526	**Réseaux CET**	**101 jrs**	**Mar 06/10/26**
1537	**Séquences CES intérieurs**	**149 jrs**	**Mer 04/11/26**
1547	**Bâtiment A**	**141 jrs**	**Ven 11/12/26**
1548	**Réseaux CET**	**88 jrs**	**Ven 11/12/26**
1559	**Séquences CES intérieurs**	**116 jrs**	**Mar 26/01/27**
1578	**Extérieurs**	**60 jrs**	**Lun 19/04/27**
1579	Espaces verts	60 jrs	Lun 19/04/27
1580	**PHASE RECEPTION**	**175 jrs**	**Lun 07/12/26**
1581	**Gymnases**	**20 jrs**	**Lun 07/12/26**
1582	OPR gymnase	20 jrs	Lun 07/12/26
1584	**Bâtiments de logements**	**91 jrs**	**Mar 16/03/27**
1585	Tests, essais et mises en services	80 jrs	Mar 16/03/27
1589	OPR	40 jrs	Mar 01/06/27
1590	Réception	0 jr	Mar 27/07/27
1592	Levée des réserves	20 jrs	Mer 28/07/27

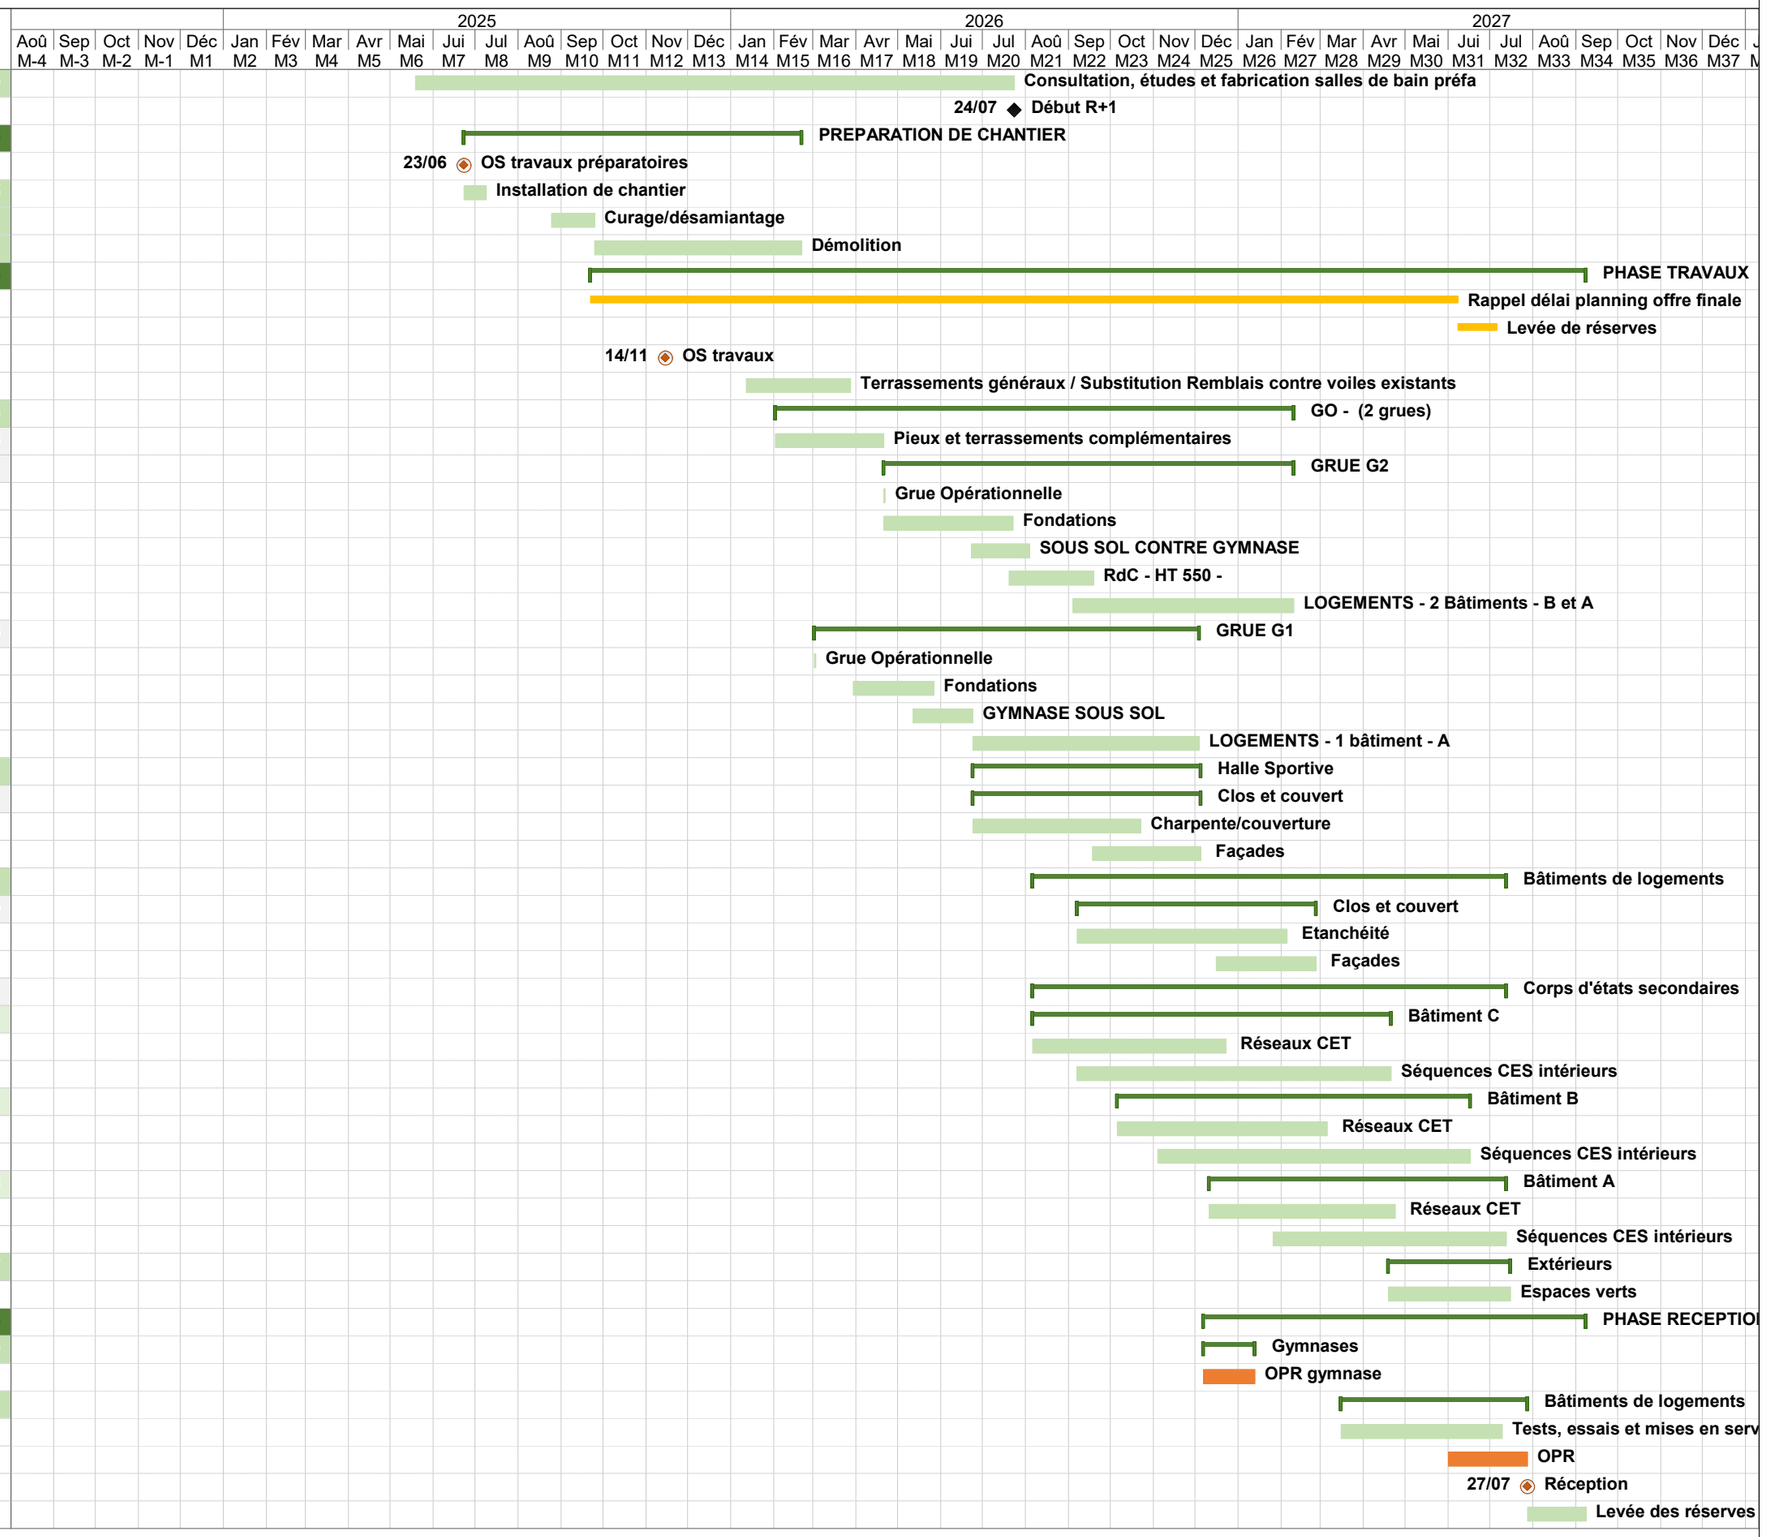

PDE
