HERLIES - EXTENSION DE LA PISCINE DES WEPPES
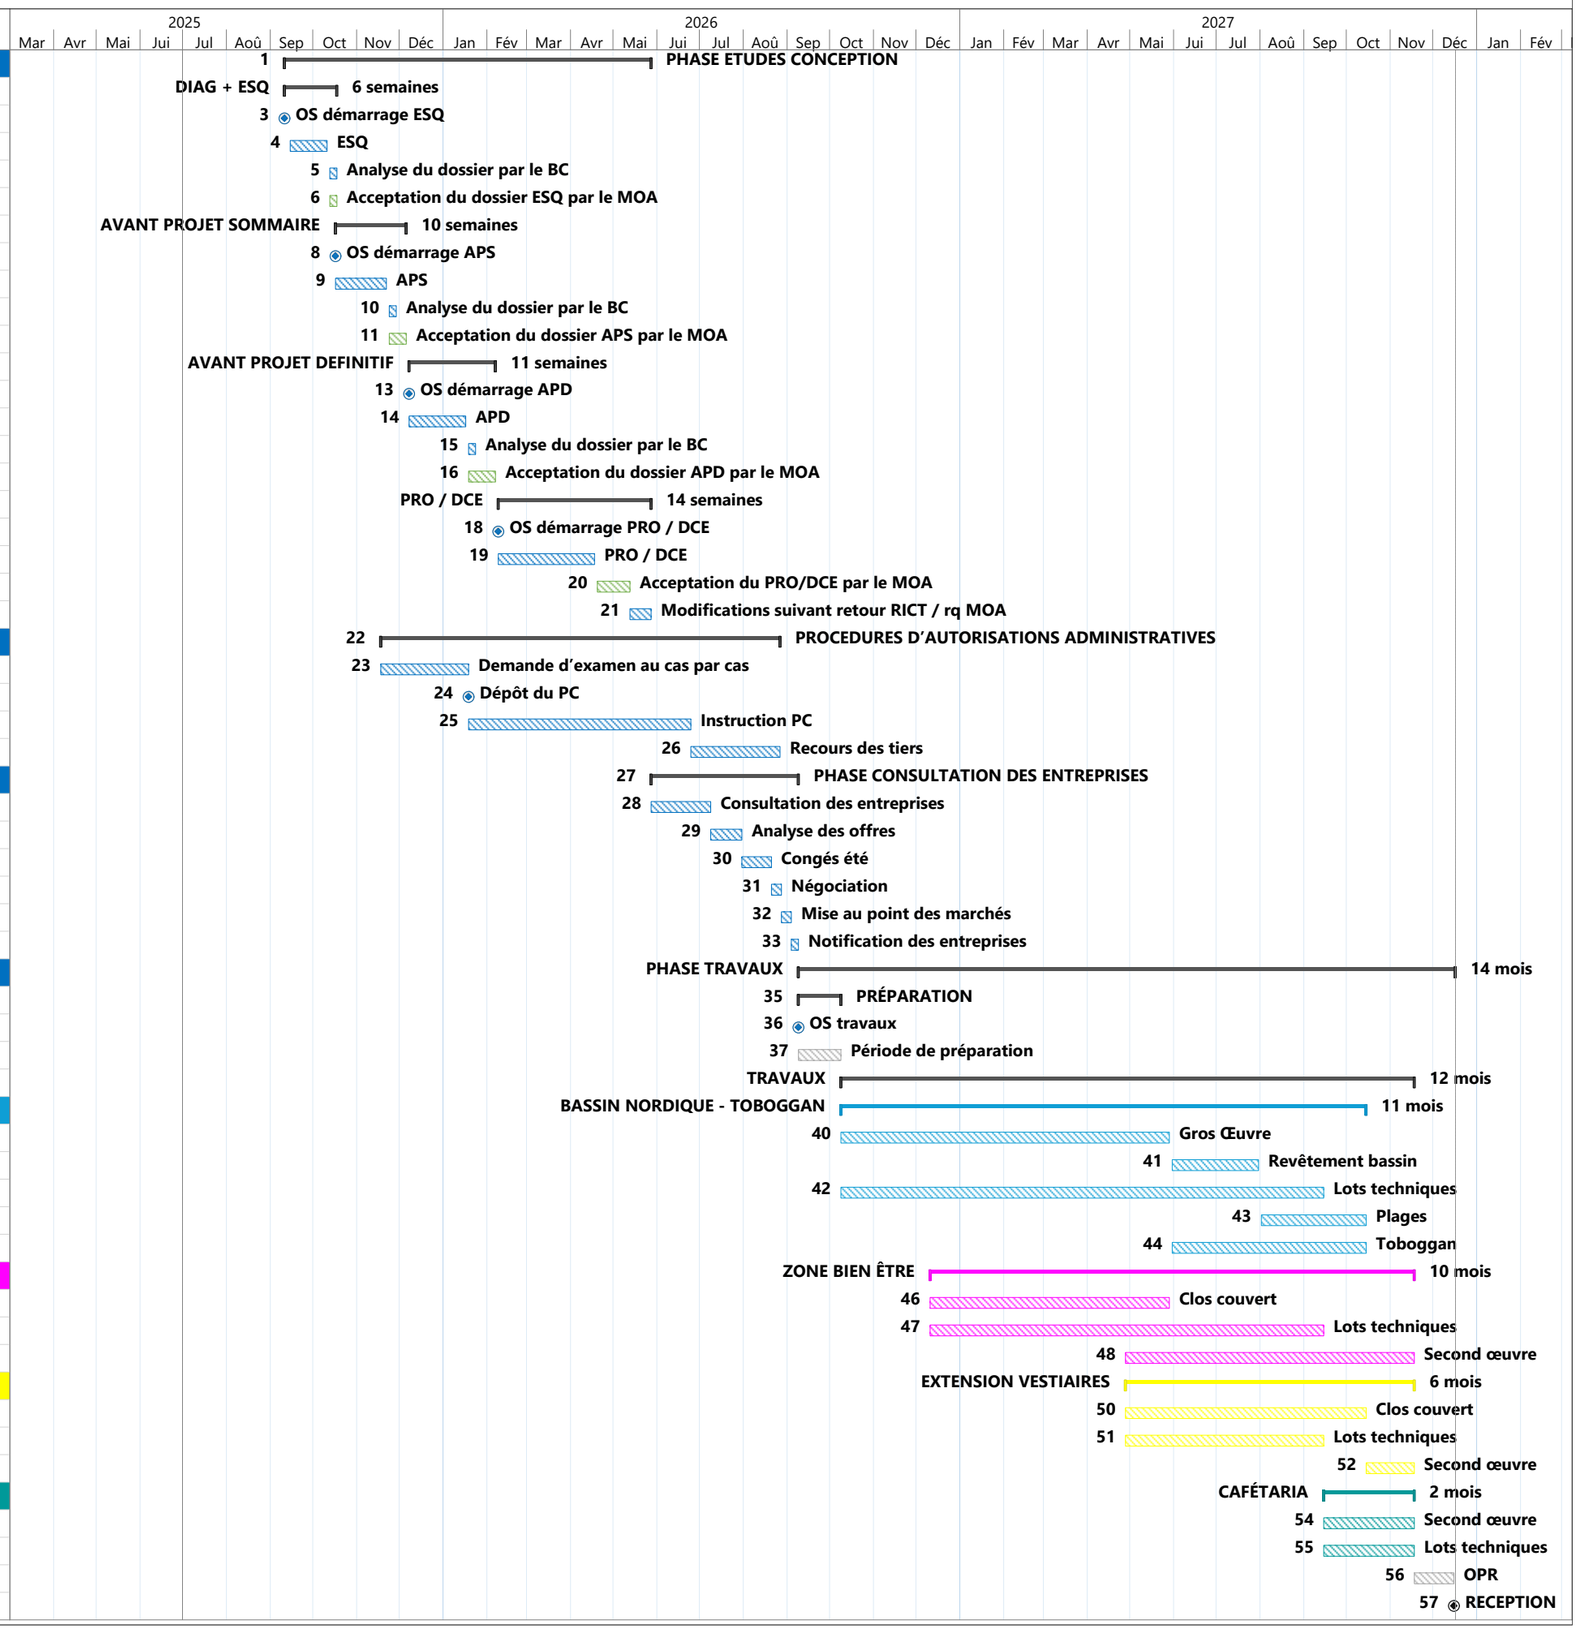
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PHASE ETUDES CONCEPTION**	**10 mois**	**Jeu 11/09/25**	**Mer 27/05/26**
2	**DIAG + ESQ**	**6 semaines**	**Jeu 11/09/25**	**Ven 17/10/25**
3	OS démarrage ESQ	1 jour	**Jeu 11/09/25**	Jeu 11/09/25
4	ESQ	4 semaines	Lun 15/09/25	Ven 10/10/25
5	Analyse du dossier par le BC	1 semaine	Lun 13/10/25	Ven 17/10/25
6	Acceptation du dossier ESQ par le MOA	1 semaine	Lun 13/10/25	Ven 17/10/25
7	**AVANT PROJET SOMMAIRE**	**10 semaines**	**Ven 17/10/25**	**Ven 05/12/25**
8	OS démarrage APS	1 jour	**Ven 17/10/25**	Ven 17/10/25
9	APS	5 semaines	Ven 17/10/25	Ven 21/11/25
10	Analyse du dossier par le BC	1 semaine	Lun 24/11/25	Ven 28/11/25
11	Acceptation du dossier APS par le MOA	2 semaines	Lun 24/11/25	Ven 05/12/25
12	**AVANT PROJET DEFINITIF**	**11 semaines**	**Lun 08/12/25**	**Ven 06/02/26**
13	OS démarrage APD	1 jour	**Lun 08/12/25**	Lun 08/12/25
14	APD	6 semaines	Lun 08/12/25	Ven 16/01/26
15	Analyse du dossier par le BC	1 semaine	Lun 19/01/26	Ven 23/01/26
16	Acceptation du dossier APD par le MOA	3 semaines	Lun 19/01/26	Ven 06/02/26
17	**PRO / DCE**	**14 semaines**	**Lun 09/02/26**	**Mer 27/05/26**
18	OS démarrage PRO / DCE	1 jour	Lun 09/02/26	Lun 09/02/26
19	PRO / DCE	10 semaines	Lun 09/02/26	Ven 17/04/26
20	Acceptation du PRO/DCE par le MOA	3 semaines	Lun 20/04/26	Mar 12/05/26
21	Modifications suivant retour RICT / rq MOA	2 semaines	Mer 13/05/26	Mer 27/05/26
22	**PROCEDURES D'AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES**	**6 mois**	**Mar 18/11/25**	**Mer 26/08/26**
23	Demande d'examen au cas par cas	2 mois	Mar 18/11/25	Lun 19/01/26
24	Dépôt du PC	1 jour	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26
25	Instruction PC	**5 mois**	Lun 19/01/26	Mer 24/06/26
26	Recours des tiers	2 mois	Jeu 25/06/26	Mer 26/08/26
27	**PHASE CONSULTATION DES ENTREPRISES**	**4 mois**	**Jeu 28/05/26**	**Mar 08/09/26**
28	Consultation des entreprises	6 semaines	Jeu 28/05/26	Mer 08/07/26
29	Analyse des offres	3 semaines	Jeu 09/07/26	Jeu 30/07/26
30	Congés été	3 semaines	Ven 31/07/26	Jeu 20/08/26
31	Négociation	1 semaine	Ven 21/08/26	Jeu 27/08/26
32	Mise au point des marchés	1 semaine	Ven 28/08/26	Jeu 03/09/26
33	Notification des entreprises	3 jours	Ven 04/09/26	Mar 08/09/26
34	**PHASE TRAVAUX**	**14 mois**	**Mer 09/09/26**	**Jeu 16/12/27**
35	**PRÉPARATION**	**1 mois**	**Mer 09/09/26**	**Jeu 08/10/26**
36	OS travaux	1 jour	Mer 09/09/26	Mer 09/09/26
37	Période de préparation	1 mois	Mer 09/09/26	Jeu 08/10/26
38	**TRAVAUX**	**12 mois**	**Ven 09/10/26**	**Mer 17/11/27**
39	**BASSIN NORDIQUE - TOBOGGAN**	**11 mois**	**Ven 09/10/26**	**Jeu 14/10/27**
40	Gros Œuvre	7 mois	Ven 09/10/26	Ven 28/05/27
41	Revêtement bassin	2 mois	Lun 31/05/27	Ven 30/07/27
42	Lots techniques	10 mois	Ven 09/10/26	Mar 14/09/27
43	Plages	2 mois	Lun 02/08/27	Jeu 14/10/27
44	Toboggan	4 mois	Lun 31/05/27	Jeu 14/10/27
45	**ZONE BIEN ÊTRE**	**10 mois**	**Ven 11/12/26**	**Mer 17/11/27**
46	Clos couvert	5 mois	Ven 11/12/26	Ven 28/05/27
47	Lots techniques	8 mois	Ven 11/12/26	Mar 14/09/27
48	Second œuvre	6 mois	Mer 28/04/27	Mer 17/11/27
49	**EXTENSION VESTIAIRES**	**6 mois**	**Mer 28/04/27**	**Mer 17/11/27**
50	Clos couvert	5 mois	Mer 28/04/27	Jeu 14/10/27
51	Lots techniques	4 mois	Mer 28/04/27	Mar 14/09/27
52	Second œuvre	1 mois	Ven 15/10/27	Mer 17/11/27
53	**CAFÉTARIA**	**2 mois**	**Mer 15/09/27**	**Mer 17/11/27**
54	Second œuvre	2 mois	Mer 15/09/27	Mer 17/11/27
55	Lots techniques	2 mois	Mer 15/09/27	Mer 17/11/27
56	**OPR**	4 semaines	Jeu 18/11/27	Mer 15/12/27
57	**RECEPTION**	1 jour	Jeu 16/12/27	Jeu 16/12/27
