DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	**BONNIER FORAGES**
Client:	**GAILLARD PIERRICK GARAGE CENTRAL** 4 BD PASTEUR 44450 LA CHAPELLE BASSE MER
Maître d'oeuvre:	**IGEFOR** 35580 GUIGNEN
Exploitant:	26 le Tertre 35580 GUIGNEN

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 4 BD PASTEUR
44450 LA CHAPELLE BASSE MER

Coordonnées : **Longitude** 372 013 **Latitude** 6 694 210 ***Altitude :*** 49.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/04/2026

Date fin de l'ouvrage : 30/05/2026

Machine :

Resp. M. Ouvrage :

Resp. M. Oeuvre :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Date fin de pompage :

Nombre de nappes identifiées :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	**GAILLARD PIERRICK GARAGE CENTRAL**
Maître d'oeuvre:	**IGEFOR**
Lieu de l'ouvrage :	**4 BD PASTEUR**
	44450 **LA CHAPELLE BASSE MER**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	7.00	ALTERATION DU SUBSTRATUM
7.00	100.00	Micaschistes albitiques à chlorite, muscovite, biotite résiduelle

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	100.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

** Reconnaissance*

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	30.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
30.00	90.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
90.00	100.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			

FORAGE D'EAU

Client : GAILLARD PIERRICK GARAGE CENTRAL
Maitre d'oeuvre : IGEFOR
Localisation de l'ouvrage : 4 BD PASTEUR
44450 LA CHAPELLE BASSE MER

Travaux réalisés : 1\1
du : 30/04/2026 au : 30/05/2026

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 372 013
Latitude (Y): 6 694 210
Altitude sol (Z): +49,000 m

Echelle : 1/503 — Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) — Nombre de forages : 1

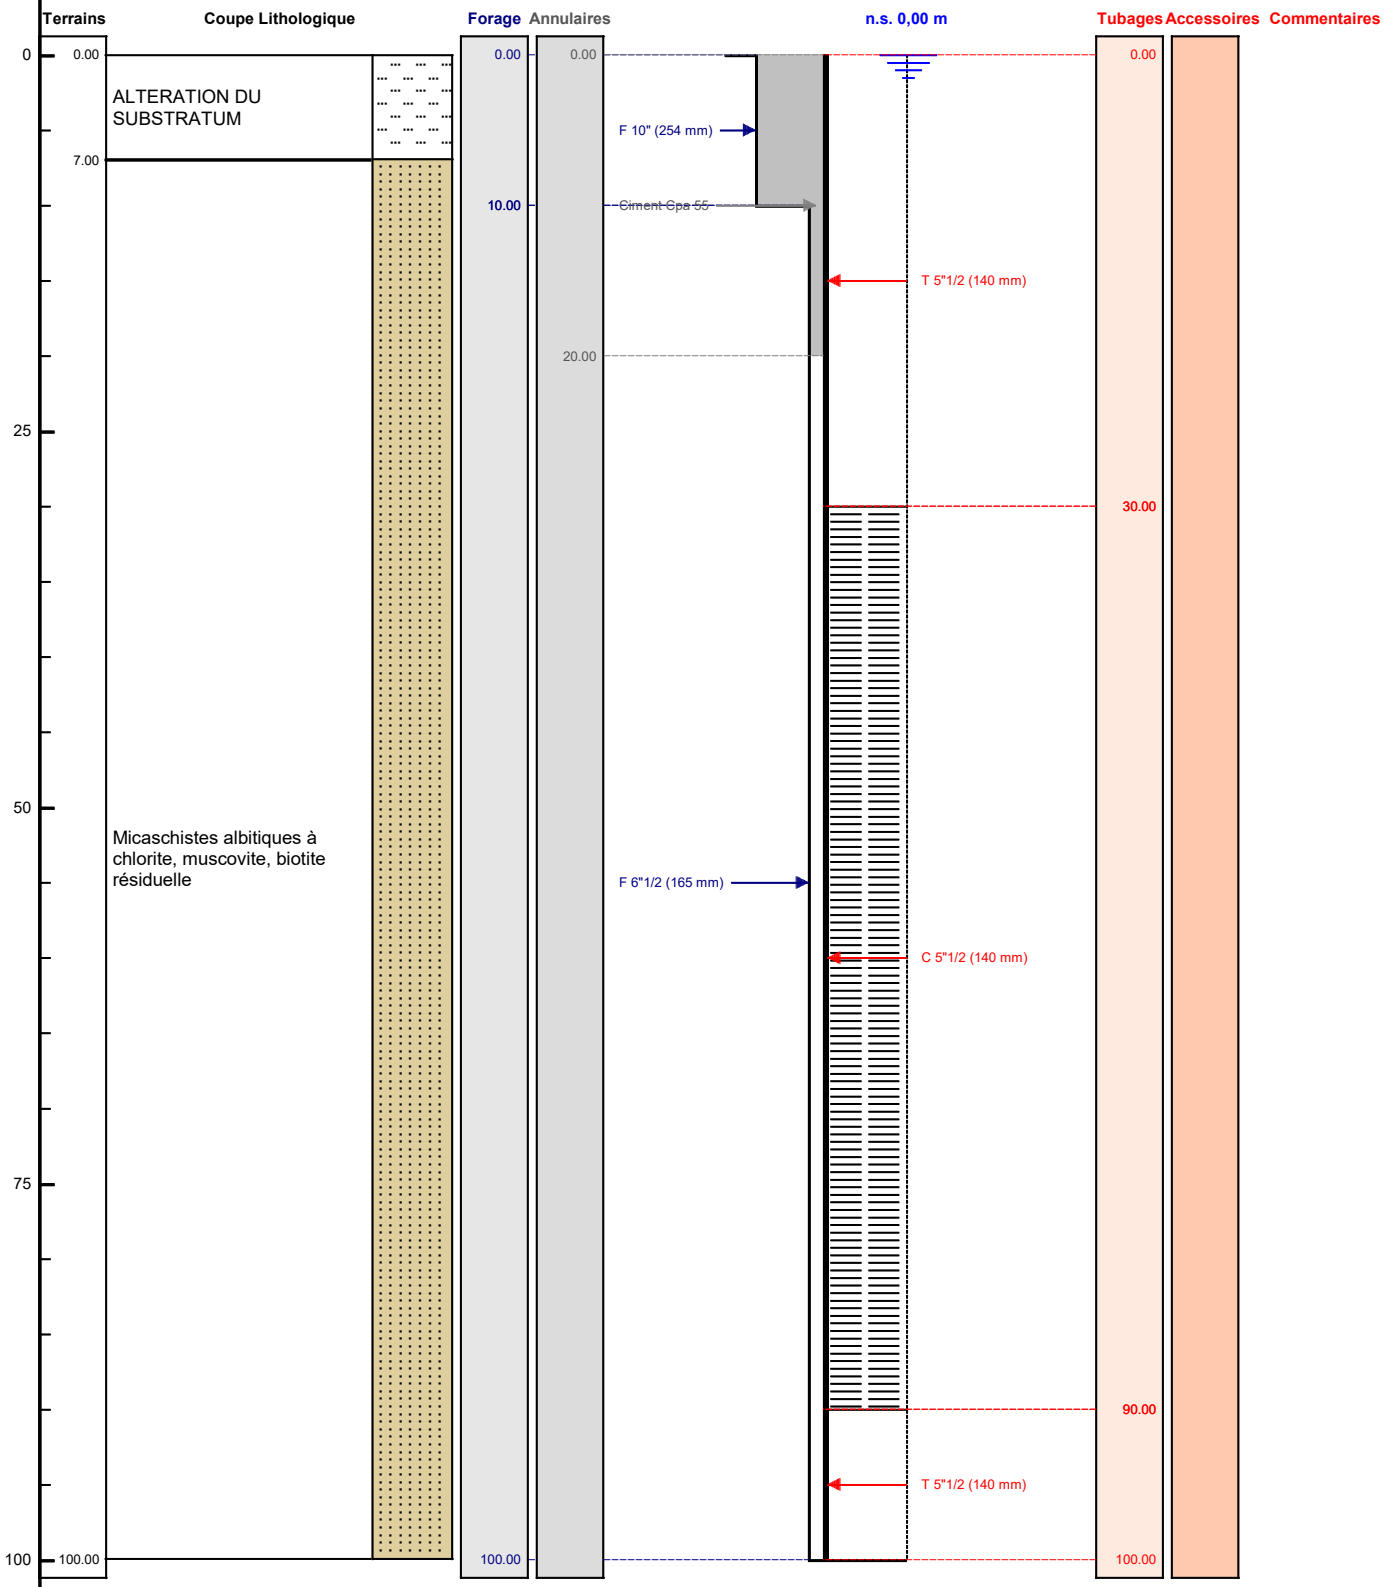

Le ...../...../..... à .....
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise
