alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

Objet de la Notice Environnementale


La présente notice environnementale décrit les principes de conception, d'implantation et de gestion du projet de parc accrobranche au Lac d'Issarlès.

Elle présente la démarche retenue pour intégrer le projet dans son environnement naturel. Cette démarche s'appuie sur des choix techniques et organisationnels adaptés au site, validés avec l'expert arboricole et le bureau d'étude environnemental.

La présente notice ne constitue pas l'évaluation des incidences environnementales du projet.
Les effets potentiels sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire font l'objet d'un document distinct : l'évaluation des incidences Natura 2000, jointe en annexe.
La notice environnementale présente :

– Les caractéristiques du site et de son contexte ;
– Les principes d'implantation du projet ;
– Les choix techniques et organisationnels ;
– Les modalités de gestion environnementale, de suivi et de réversibilité.

Elle complète la notice paysagère du projet transmise en Annexe

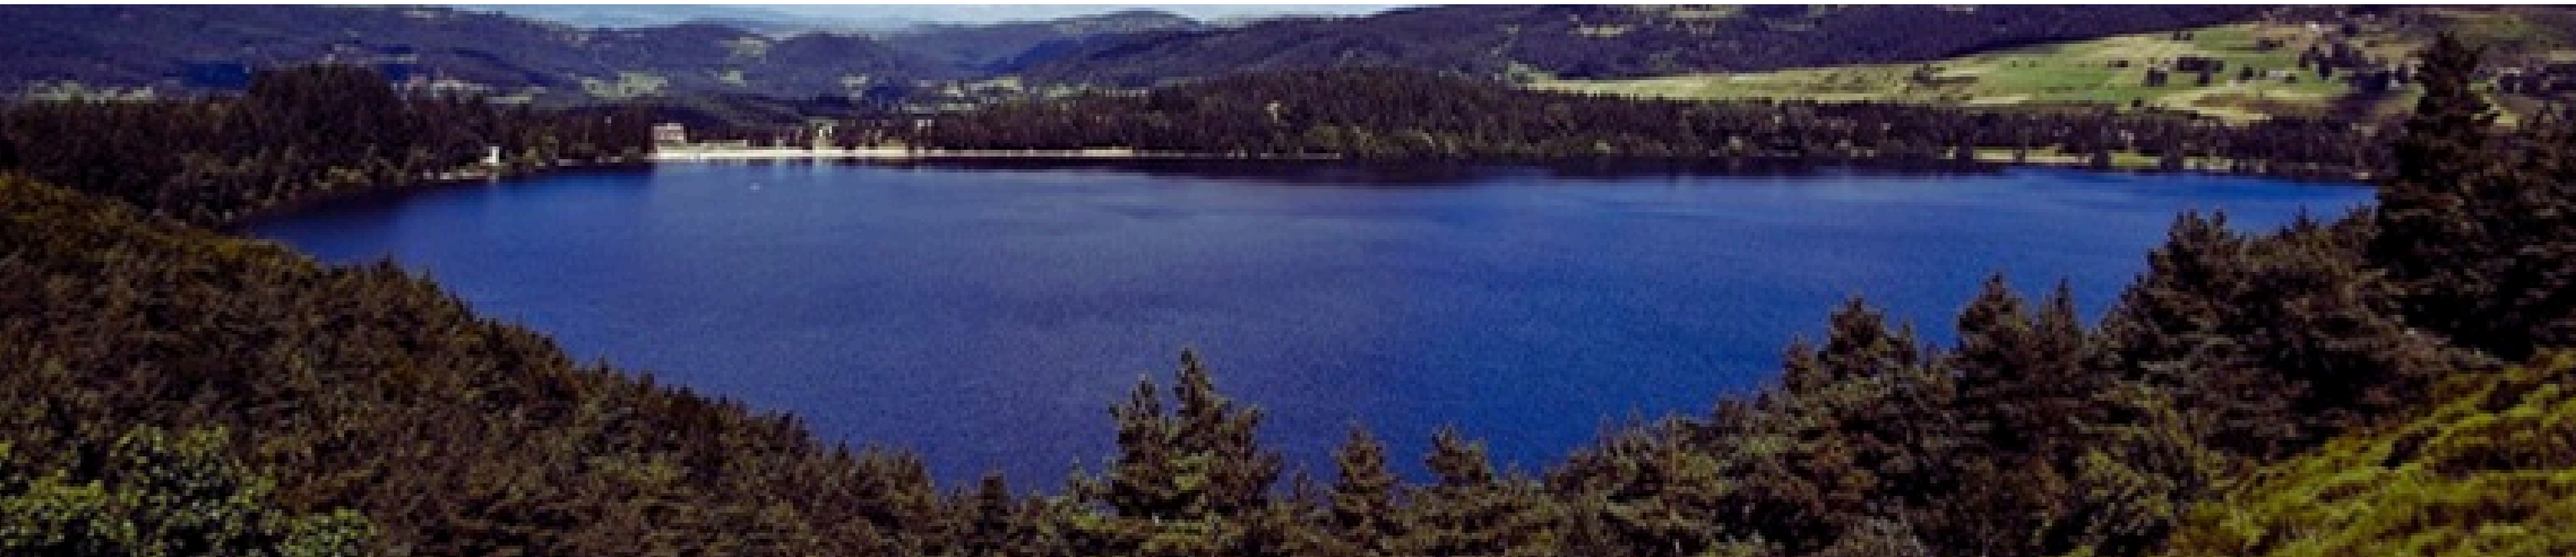

Index

p1 Objet de la Notice Environnemental
p3 Le Projet Accrobranche au Lac d'Issarlès
1 . Localisation
p4 1.1 Repérage du Projet sur Plan de Situation (carte au 25 millième)
p5 1.2 Extrait Cadastrale
p6 1.3 Contexte Environnemental Général du Site
p7 2 . Typologie Forestière
p8 2.1 Carte de la Végétation et des Habitats Naturels
p9 3. Implantation des Installations dans le Milieu Forestier
3.1 Arbres Supports et Plateformes
p10 3.2 Cheminements et Déplacements au Sol
p11 4 . Modalités de Mise en œuvre des Travaux
4.1 Principes Généraux du Chantier
p12 4.2 Déroulement des Travaux en Hauteur
p13 4.3 Mise en Place des Plateformes et des Lignes de Vie
p14 Plan d'Implantation de la Zone d'Accueil, la Zone de Travaux et de Stockage des Matériaux
p15 Plan d'Implantation de la Zone de Travaux sur les Arbres
p16 4.4 Impact sur les Arbres : Perçage contre Encerclage
p17 5. Choix Techniques et Matériaux
p17 5.1 Les Matériaux Utilisés
p18 5.2 Système de Fixation des Plateformes avec la méthode KujanaK
p19 5.3 Système de Fixation des Lignes de vie, des Plateformes et des Agrès
p20 5.4 Cable Utilisé
p21 5.5 ligne de vie Coudou
p22 6 . Modalités de Gestion du Site en Phase d'Exploitation
6.1 Organisation de l'activité et Gestion de la Fréquentation
p23 Accès et Circulation sur le site et Plan d'Évacuation
p24 6.2 Interventions de Maintenance et d'Entretien
p25 7. Présence Humaine, Sensibilisation et Surveillance du Site
p26 8. Démarche volontaire d'accompagnement Écologique et actions de sensibilisation
p27 9. Réversibilité des Installations et remise en état du Site

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

1 . Localisation

Le projet d'accrobranche au Lac d'Issarlès consiste à créer un Parcours Acrobatique en Hauteur (PAH), communément appelé "accrobranche", sur la commune du Lac d'Issarlès (07470) au cœur de la Montagne Ardéchoise





1.1 Repérage du Projet sur Plan de Situation (carte au 25 millième)



alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

1.2 Extrait Cadastral


Zone d’emprise exacte du projet sur les parcelles AH 586 , AH 585 et AH 004



1.3 Contexte Environnemental Général du Site p6

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

- Le Site se situe dans un massif forestier en périphérie immédiate du Lac d'Issarlès.
- Il se trouve dans un secteur fortement fréquenté, en lien direct avec les équipements touristiques existants (plages, parking communal, cheminements piétons, parcours sportifs).
- Le site ne constitue pas un espace isolé. Il s'inscrit dans un environnement déjà marqué par une fréquentation humaine importante, notamment en période estivale.
- La fréquentation devient ponctuellement très élevée aux abords du parking et des accès au lac.
- Les Usages actuels génèrent des circulations diffuses en sous-bois sans organisation précise. Des incivilités ponctuelles sont également observées (abandons de déchets, piétinements hors cheminements).
- Les éléments relatifs à la localisation du Site, à son insertion paysagère et aux co visibilités sont présentés dans la notice paysagère jointe au dossier.

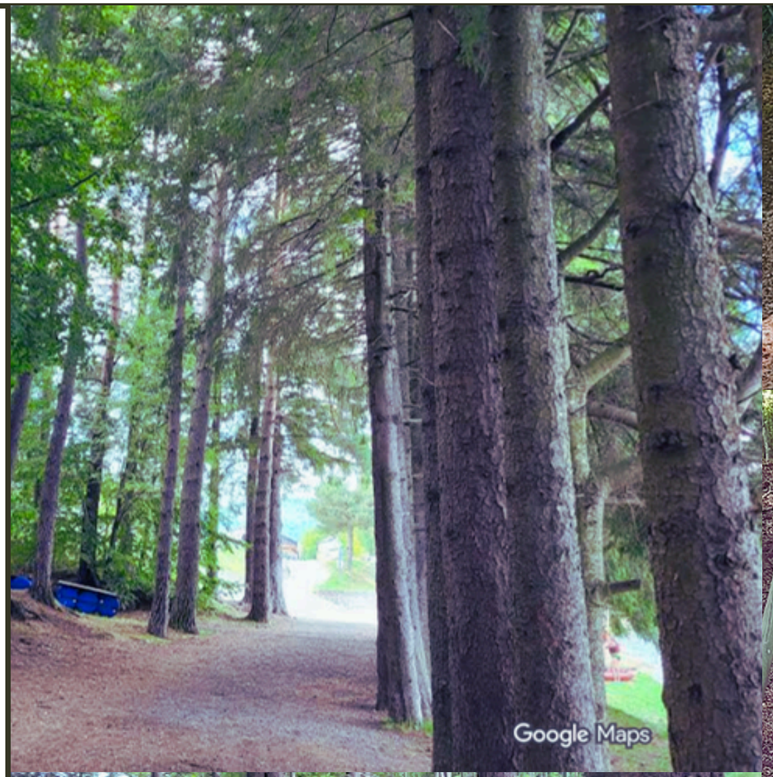









2 . Typologie Forestière

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

Le Site présente deux grands types de Peuplements Forestiers.

- **Forêt de Douglas (partie haute)**
  La partie amont est occupée par une futaie de Douglas (Pseudotsuga menziesii) issue d'anciennes plantations. Les arbres sont de grand diamètre et de hauteur importante.
  Le couvert est fermé et le sol forestier est peu perturbé. La structure du peuplement est régulière.
  Le sol est majoritairement recouvert d'aiguilles de résineux, ce qui limite le développement de la végétation herbacée et le piétinement.
  Cette zone constitue une transition entre les espaces artificialisés du parking et les milieux plus naturels situés vers le Lac.

- **Forêt de Hêtres (partie basse)**
  En descendant la pente vers la droite du site, le peuplement évolue vers une Hêtraie (Fagus sylvatica) à structure plus irrégulière.
  Cette zone présente une pente plus douce, un sous-bois plus développé et une ambiance plus naturelle.

- **Lande à Genêts**
  En lisière du parking, le couvert forestier laisse ponctuellement place à une lande à Genêts. Cette zone est plus ouverte et déjà anthropisée.







2.1 Carte de la Végétation et des Habitats Naturels

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

Carte de la végétation et des habitats naturels de la zone d'implantation du projet de parc d'accrobranche sur la commune du Lac-d'Issarles



3. Implantation des Installations dans le Milieu Forestier

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

3.1 Arbres Supports et Plateformes

- Les Plateformes et les Ateliers sont implantés uniquement sur des Arbres supports sélectionnés individuellement.
- La sélection repose sur l'état sanitaire des arbres, leurs caractéristiques mécaniques, leur port et leur position dans le massif.
- Chaque Arbre support est validé au préalable par un expert arboricole.
- Des Opérations d'élagage ciblées peuvent être réalisées si nécessaire pour garantir la sécurité des installations et des circulations.
- Aucune coupe systématique n'est prévue dans le cadre du projet (cf. rapport de pré construction de l'expert arboricole).
- Le Tracé des Parcours s'adapte à la structure du peuplement existant sans coupe d'arbres.
- Les Parcours permettent une progression fluide et sécurisée des participants.
- Les Plateformes sont installées à des hauteurs variables adaptées à la configuration du site et aux contraintes de sécurité.






3.2 Cheminements et Déplacements au Sol

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

- Les Déplacements des pratiquants au sol s'appuiront sur les cheminements existants, déjà empruntés par le public.
- Le Projet ne prévoit pas la création d'un réseau de nouveaux sentiers en sous-bois.
- Ces Cheminements seront matérialisés (sentiers encordés) afin de canaliser les déplacements et d'éviter la multiplication de passages en dehors des zones prévues.
- L'Objectif sera d'organiser les circulations au sol pour limiter le piétinement diffus, tout en assurant une lisibilité claire des parcours et des accès pour les usagers.

Exemple de Cheminement délimité par cordages discrets permettant de canaliser les flux, sans clôture rigide ni impact visuel dans la forêt :

- La matérialisation des Cheminements répond à un objectif de protection du milieu naturel et de sécurité des personnes
- Elle contribue également à prévenir les phénomènes d'érosion liés au piétinement du sous-bois.
- Elle permet de canaliser les déplacements du public vers des zones adaptées, d'éviter les secteurs à pente marquée ou présentant des contraintes particulières,
- De maintenir les circulations en dehors des zones situées sous les parcours aériens, notamment les tyroliennes.





alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

4.1 Principes Généraux du Chantier

- Une Zone de Travaux est installée sur le parking existant, déjà artificialisé.
  Elle est utilisée pour la fabrication des plateformes, la préparation des agrès et le déroulage des câbles.

- Les Travaux sont réalisés sans engins lourds et sans terrassement.
  L'organisation du chantier vise à limiter au maximum les interventions au sol en milieu Forestier.

- Les Travaux en milieu Forestier sont réalisés exclusivement à pied.

- Le chantier est conduit selon une logique de faible empreinte, en limitant le bruit et le dérangement du Site.
  L'équipe mobilisée est réduite (une à trois personnes).

- Les Interventions sont réalisées à l'aide d'outils portatifs majoritairement électriques.

- Les produits potentiellement polluants (huiles, lubrifiants) sont conservés sur le parking dans des contenants fermés et adaptés.
  Ils sont transportés dans un véhicule dédié, sans manipulation ni stockage en milieu forestier.

- Aucun produits phytosanitaire ne sont utilisés durant les travaux.

- Lors des opérations ponctuelles nécessitant une tronçonneuse, un kit antipollution est systématiquement disponible pour intervenir en cas de fuite accidentelle.

- Les interventions les plus sonores (élagage, perçage, découpe) sont réalisées en journée, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de nuisances sonores.

- La Phase Principale de travaux est programmée hors haute saison touristique.

- Les Travaux sont prévus entre septembre et février, en cohérence avec l'Expertise Arboricole et le Bureau d'étude environnementale.

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

4.2 Déroulement des Travaux en Hauteur

Les Interventions en Hauteur débutent par la mise en place de cordes d'accès et de sécurité dans les arbres supports, à une hauteur comprise entre 10 et 12 mètres.

- Avant la Pose des équipements, des opérations d'élagage ciblées sont réalisées si nécessaire pour dégager les zones de passage et sécuriser les trajectoires.

- Les opérations d'élagage concernent uniquement les branches cassées ou sans fonction mécanique, conformément aux préconisations de l'Expertise Arboricole.


- Les branches supprimées sont de faible diamètre (≤ 5 cm). Elles n'affectent pas la structure ni la viabilité des arbres conservés.

- Les rémanents d'élagage sont laissés au sol dans des secteurs non fréquentés, hors cheminements et zones d'activité, ainsi que dans des zones de mise en défens spécifiquement définies.
  Ils participent à la régénération de l'humus et constituent des refuges pour la petite faune.

Les Arbres à cavités potentielles sont évités en concertation avec l'Expert Arboricole et l'Écologue afin d'éviter tout dérangement des Chiroptères et de l'Avifaune.





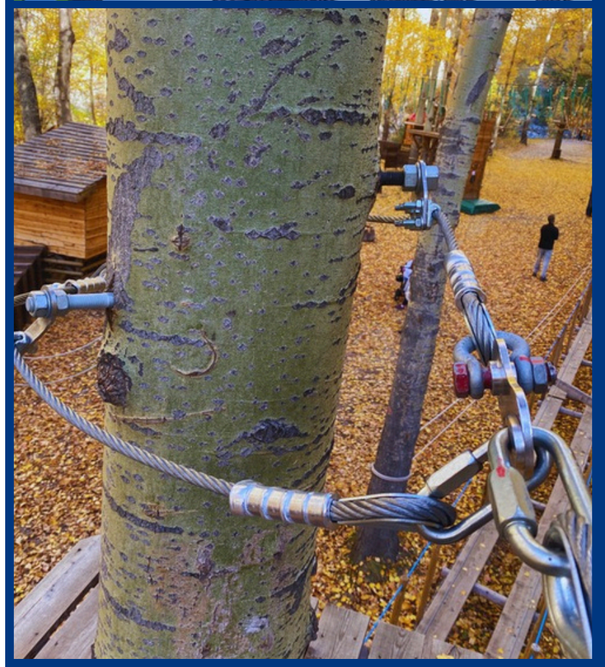



alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

4.3 Mise en Place des Plateformes et des Lignes de Vie

Préparation des Plateformes :

- Les Plateformes sont d'abord découpées et assemblées sur le parking existant.
- Elles sont ensuite acheminées à pied jusqu'au pied des arbres supports.
- Les Plateformes sont montées à l'aide de cordes préalablement installées dans les arbres. Elles sont hissées jusqu'à leur emplacement défini en amont.
- Chaque Plateformes est fixée par perçage ponctuel de l'arbre support. La fixation est réalisée sans cerclage et sans contrainte mécanique supplémentaire sur l'arbre.
  (CF page sur le principe de Perçage Partielle)

Mise en place des Ancrages de Lignes de Vie :

- Une fois la Plateforme installée, les perçages d'ancrage des lignes de vie sont réalisés entre 1,10 m et 1,30 m au-dessus du niveau de la Plateforme.
- Les Clous supports de Lignes de Vie sont ensuite insérés et fixés dans les arbres.
- Les Câbles sont découpés sur le parking existant puis acheminés sur site. Ils sont ensuite installés entre les différentes Plateformes du parcours.

Montage des Agrès (Jeux)

- Les Agrès sont conçus et assemblés au sol sur le parking existant.
- Ils sont ensuite acheminés à pied jusqu'aux zones d'installation.
- Les éléments sont hissés à l'aide de cordes fixées dans les arbres.
- Une fois l'Opérateur sécurisé sur la Ligne de Vie, les perçages d'ancrage des Agrès sont réalisés. Les clous supports sont mis en place puis les jeux sont installés.

Outils portatifs utilisés :


- Boulonneuse
- Scie sauteuse
- Perceuse
- Disqueuse
- Sertisseuse Électrique
- Clés Manuelles
- tronçonneuse éléctrique

Outils utilisés (parking) :

- Scie circulaire radiale
- Disqueuse (pour les câbles)
- Scie Sauteuse

L'ensemble des travaux est réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences de la norme NF EN 15567 relative aux parcours acrobatiques en hauteur. Le site fera l'objet d'un contrôle par un organisme indépendant agréé.

Plan d'Implantation de la Zone d'Accueil, la Zone de Travaux et de Stockage des Matériaux

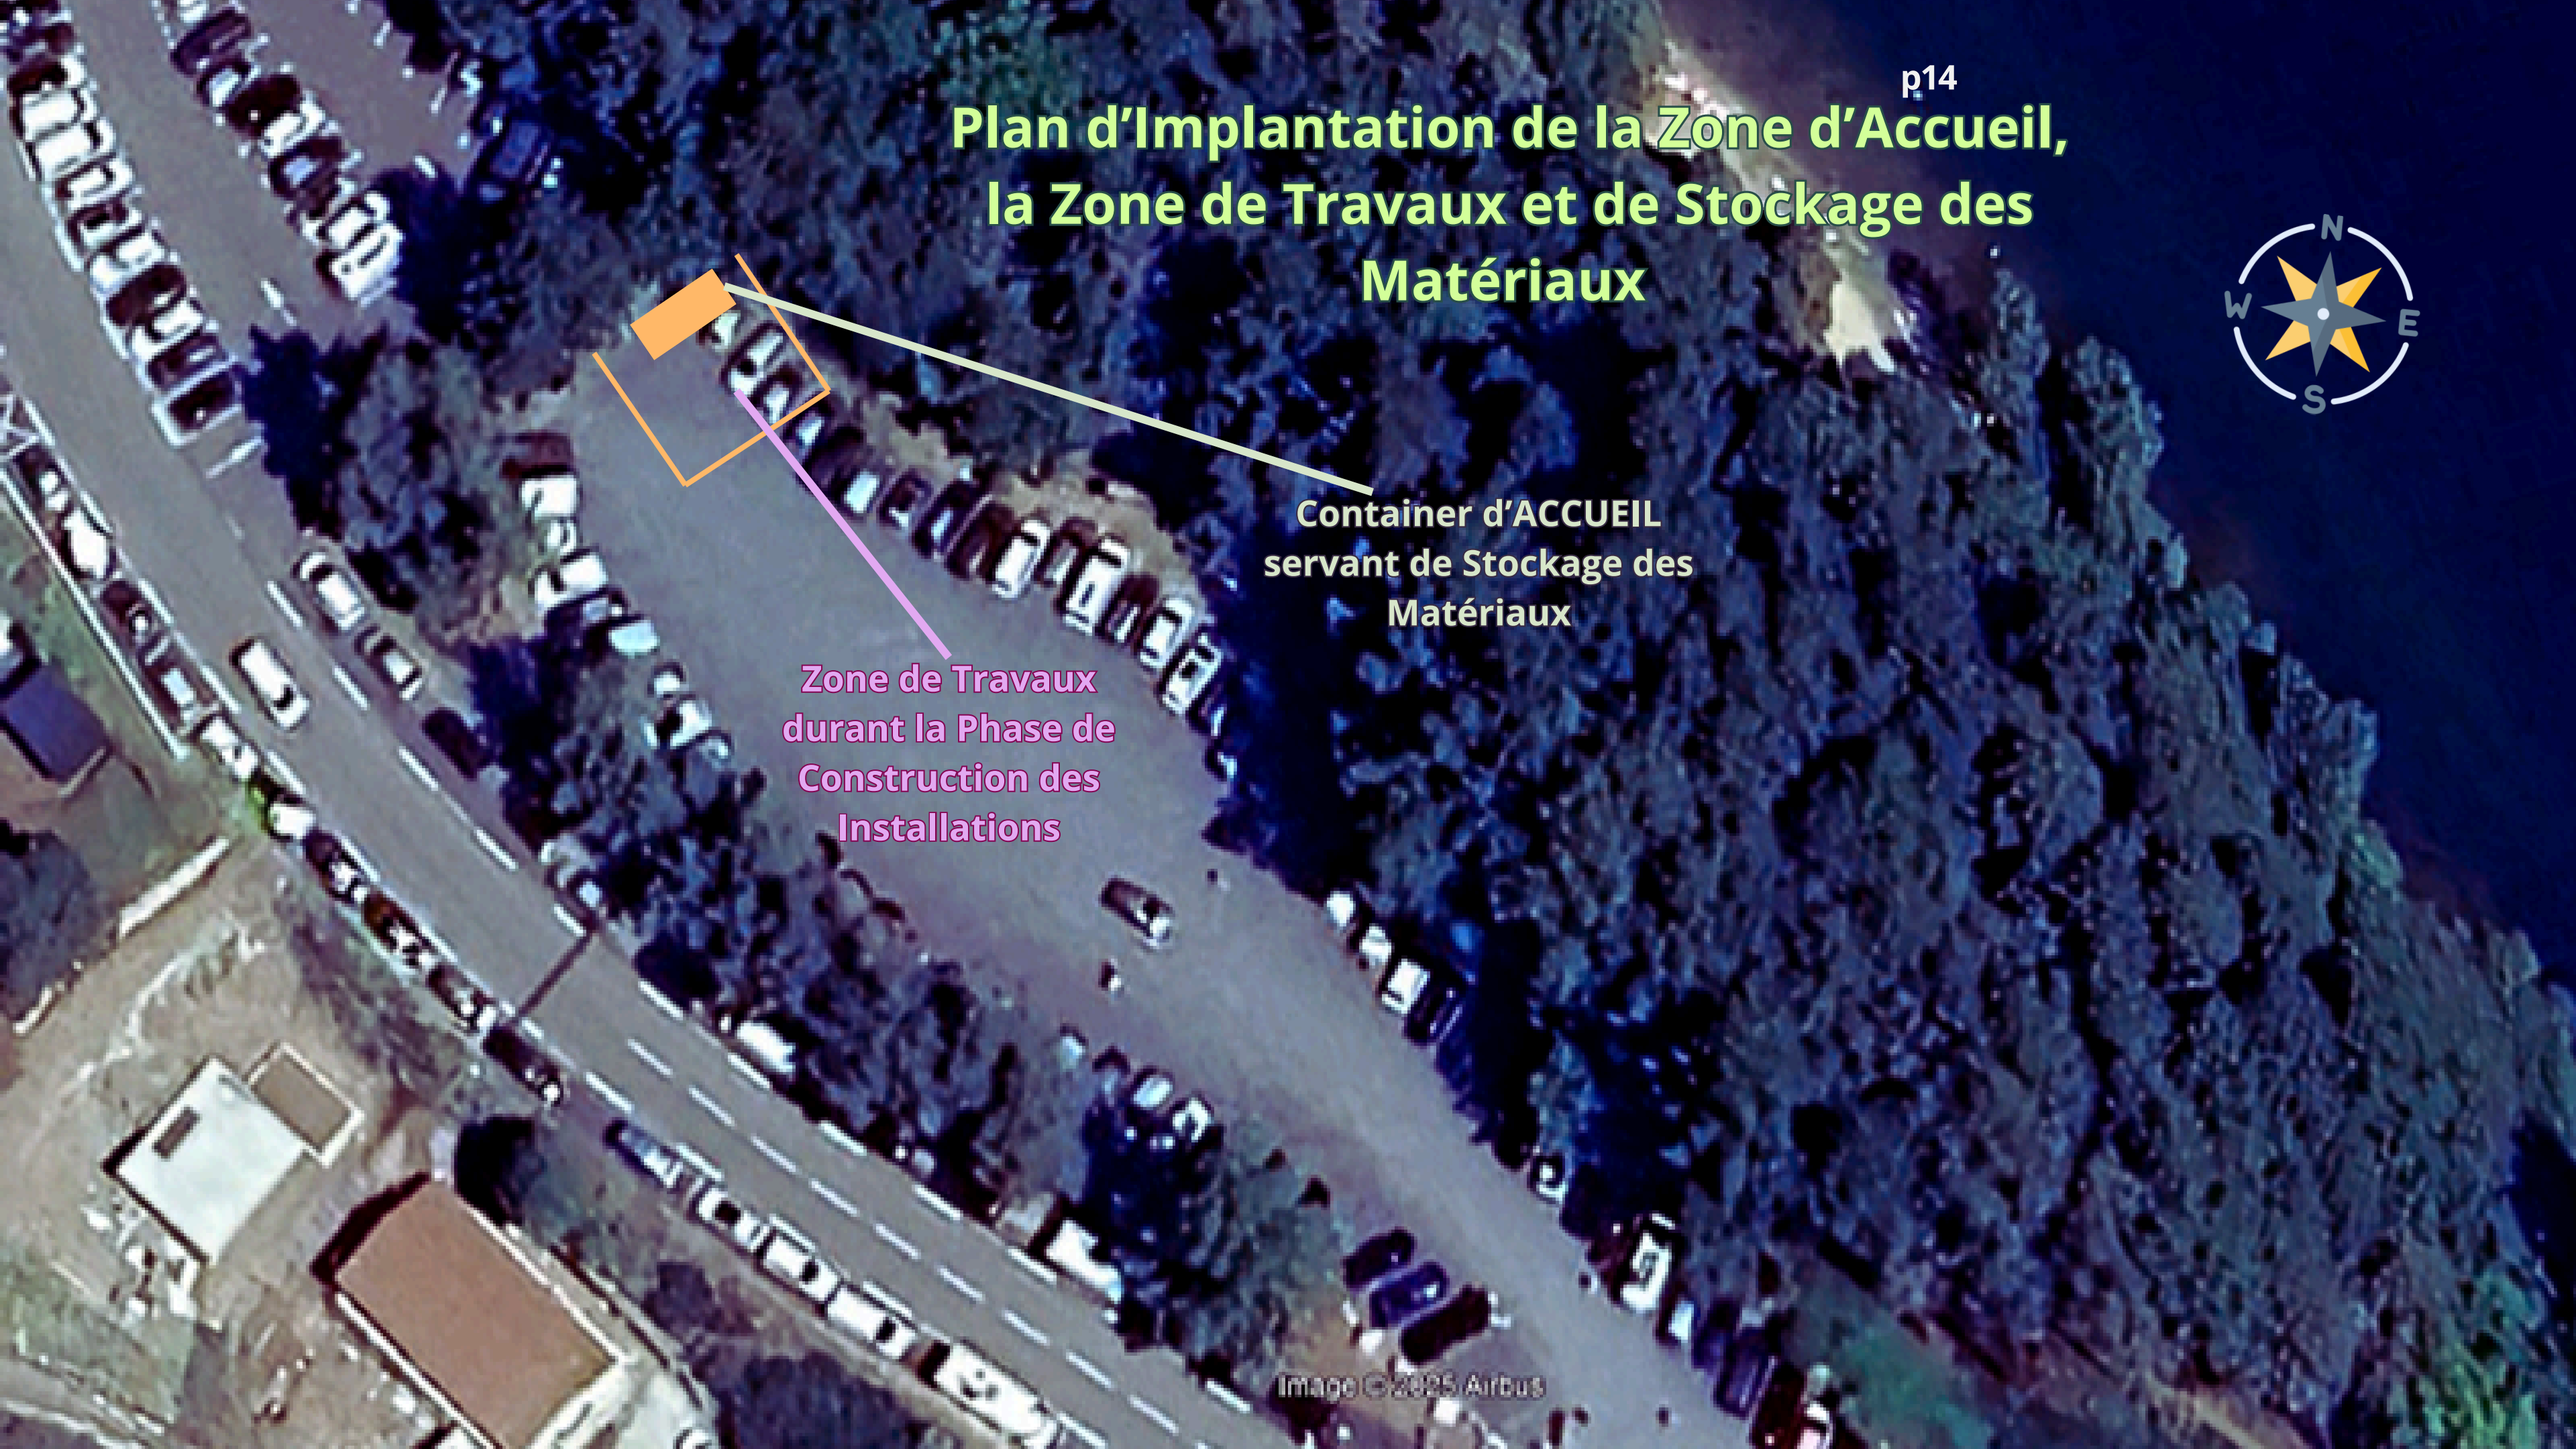

Plan d'Implantation de la Zone de Travaux sur les Arbres



: Jeux (Ateliers ou Agrès)

: Arbres et Plateformes

: Sentier déjà existant servant pour le parcours sportif

Google Earth

4.4 Impact sur les Arbres : Perçage contre Encerclage

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

Les anciens systèmes de calage exerçaient une pression excessive sur le tronc, comprimant l'écorce et empêchant la circulation normale de la Sève jusqu'à l'aubier.

Cette compression, équivalente à un garrot, pouvait affaiblir l'arbre à la fois mécaniquement et biologiquement, compromettant sa croissance et sa durabilité.


Ces méthodes ne sont désormais plus recommandées par les Experts Arboricoles.

La méthode Actuelle, basée sur le Perçage Partiel, préserve l'intégrité de l'Arbre.

L'Écorce et le Cambium, où circulent les Sèves montantes et descendantes, restent intacts, garantissant l'alimentation et le développement de l'Arbre.

Le Duramen, cœur central du tronc, assure le soutien mécanique de l'Arbre. Grâce à cette technique, l'arbre peut continuer à croître normalement, tout en permettant une fixation solide et pérenne des structures sans compromettre sa santé.

L'Arbre réagit, créant un bourrelet cicatriciel qui va peu à peu englober le clou. Les impacts visuels, physiologiques et sanitaires du parc sont considérablement diminués grâce à cette technique.

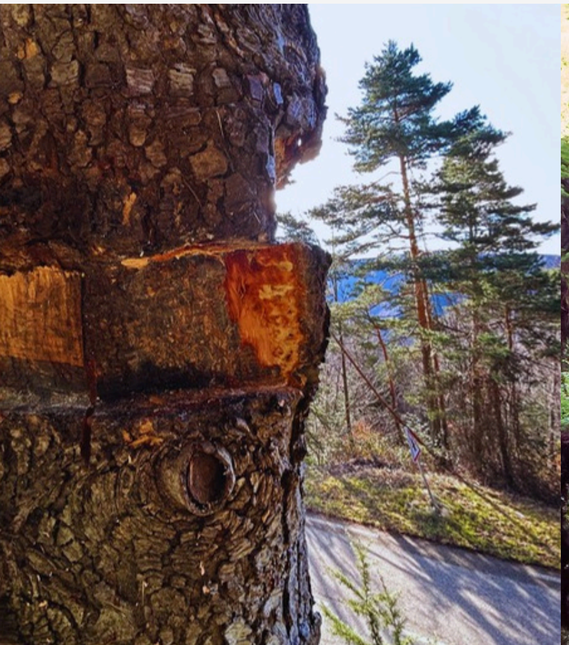







alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

5.1 Les Materiaux Utilisés

Les Aménagements sont réalisés en Bois afin d'assurer une cohérence esthétique avec la Forêt environnante.
Les Plateformes sont construites en bois Douglas, une essence locale naturellement durable et résistante aux intempéries, limitant ainsi l'empreinte carbone du projet.

Les Structures Porteuses utilisent des Madriers en Pin douglas classe 3 (100 × 150 mm), ainsi que les Lames de Terrasse en pin Douglas (14,5 × 3.2 cm) reprennent la teinte des Arbres présents en majorité sur le site.

Les Appuis et Éléments ronds sont réalisés en rondins de 100 mm, permettant une finition robuste et visuellement homogène.
Lorsqu'une plateforme est neuve, le Bois apparaît plus clair et contraste temporairement avec la couleur de la forêt.

Sous l'effet du temps, des UV et des intempéries, il se patine progressivement, s'assombrit et adopte une teinte plus naturelle, se fondant complètement dans son environnement.







5.2 Système de Fixation des Plateformes avec la méthode KujanaK

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

Mise en Place Technique des Plateformes :

La Structure des Plateformes est entièrement **préassemblée au sol (parking)**, puis acheminée à son emplacement dans l'Arbre.
Une fois stabilisée à l'aide de sangles, un **perçage partiel** d'environ 10 cm est réalisé sur les **quatre côtés** de la **structure** afin d'y insérer **goujons et inserts.**

Ce système garantit une **tenue optimale** tout en préservant la **vitalité** de l'Arbre : la **circulation** de la Sève reste **intacte** et **aucun point de pression durable** n'est exercé sur l'Écorce.

Après la **fixation sécurisée** de la Structure, le Platelage est installé en dernière étape, à l'aide de Lames de Terrasse posées avec un léger écartement entre chaque Lame.
Cet espacement permet à l'**eau de ruisseler naturellement** en cas de pluie et **évite toute imperméabilisation** du sol autour du Tronc.

L'ensemble constitue une installation robuste, durable et parfaitement respectueuse de la santé des arbres et qui nécessite peu de maintenance à long terme









5.3 Système de Fixation des Lignes de vie, des Plateformes et des Agrès

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

Installation des Lignes de Vie :

Les lignes de vie sont installées une fois les Plateformes en place, en respectant des procédures de perçage partiel des Arbres (70 à 90 mm).


Les Clous ainsi installés permettent de fixer à la fois les Câbles et Plaquettes de ligne de vie, ainsi que les différents agrès des parcours.
Le Perçage et la Fixation des Lignes de Vie sont réalisés conformément aux normes NF EN 15567-1 et NF EN 15567-2, garantissant la sécurité et la durabilité de la structure pour la construction et l'exploitation des Parcours.

Cette méthode permet également une réversibilité complète, offrant la possibilité de démonter les structures sans endommager les arbres, tout en conservant une fixation solide et respectueuse du milieu.







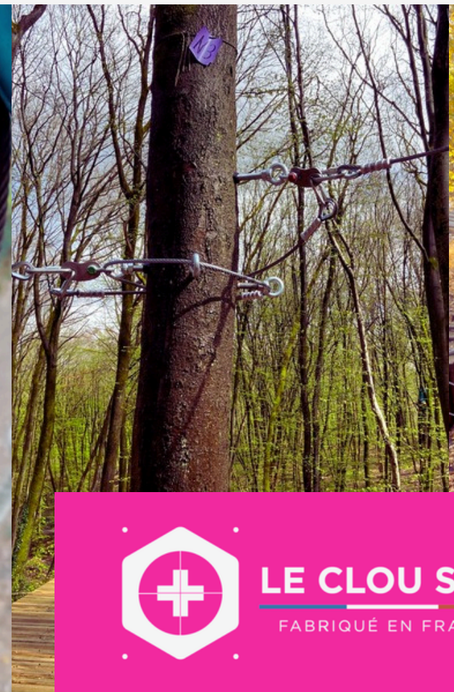



5.4 Cable Utilisé

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

Câbles et supports métalliques :

Les Lignes de Vie et les parcours au niveau des pieds sont équipés de câbles en acier galvanisé 19x7 de 12 mm de diamètre, assurant une résistance mécanique élevée et une durabilité optimale face aux contraintes climatiques et d'utilisation.

Les supports d'Agrès utilisent des câbles en acier galvanisé 19x7 de 10 mm, offrant un compromis idéal entre résistance et flexibilité pour les éléments mobiles des parcours.

Les Tyroliennes sont équipées de câbles en acier antigiratoire, conçus pour réduire les vibrations et les bruits induits par le passage des usagers, permettant ainsi de préserver le calme et l'ambiance naturelle de la Forêt.









5.5 ligne de vie Coudou

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

- **Système de connexion «Zaza» :**

Le système Zaza consiste en une navette reliée par une longe au baudrier, utilisée comme connecteur avec le câble de la ligne de vie.
À l'entrée de chaque parcours, l'usager insère son connecteur dans la ligne de vie. Celui-ci ne peut être retiré qu'à la fin du parcours, assurant une sécurité continue tout au long de la progression sur les agrès.

Le passage d'un Agrès à l'autre s'effectue via de plaquettes intermédiaires, qui maintiennent le câble de la Ligne de Vie. Le connecteur, grâce à sa petite ouverture calibrée, peut simplement passer à travers ces plaquettes sans nécessiter de manipulation supplémentaire, garantissant fluidité et sécurité à chaque transition.

- **Plaquette LDV pour passage des agrès**
- **Plaquette de ligne de vie support de tyrolienne jusqu'à 150m de longueur**

- **Poulie SBE – usage sur tyroliennes :**

La poulie SBE n'est pas un Équipement de Protection Individuelle (EPI) et ne constitue donc pas un élément de sécurité. Elle est uniquement destinée à permettre la progression sur les Tyroliennes.
La poulie est conçue avec des roulements interchangeables et des roulettes en plastique, ce qui permet de réduire le bruit et le niveau sonore dans la forêt, d'améliorer le confort d'utilisation et de limiter l'usure des câbles.











6 . Modalités de Gestion du Site en Phase d'Exploitation

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

6.1 Organisation de l'activité et Gestion de la Fréquentation

Le Parc est ouvert de la période des vacances de Pâques à la Toussaint.

- **En période de vacances scolaires, l'ouverture est assurée tous les jours.**
  Hors vacances scolaires, le parc est ouvert les week-ends et jours fériés, avec possibilité d'ouverture en semaine sur demande.

- **L'Activité est exercée exclusivement en période diurne. Aucun éclairage nocturne ni sonorisation permanente n'est prévu.**

- **La capacité maximale d'accueil est limitée à 120 pratiquants par jour.**

- **La fréquentation du site est encadrée par l'Organisation des Parcours, la Gestion des Flux et la présence constante de Personnel sur Site.**


  Le projet contribue ainsi à structurer les usages déjà présents sur le secteur.

- **Les modalités d'exploitation ont été définies afin de limiter la pression sur le milieu naturel.**

- **La gestion du site repose sur une logique d'adaptation continue.**

En cas d'enjeux environnementaux particuliers, les modalités d'exploitation pourront être ajustées en lien avec le Bureau d'Étude Environnemental et les Services Compétents

plan d’implantation de la zone d’accueil

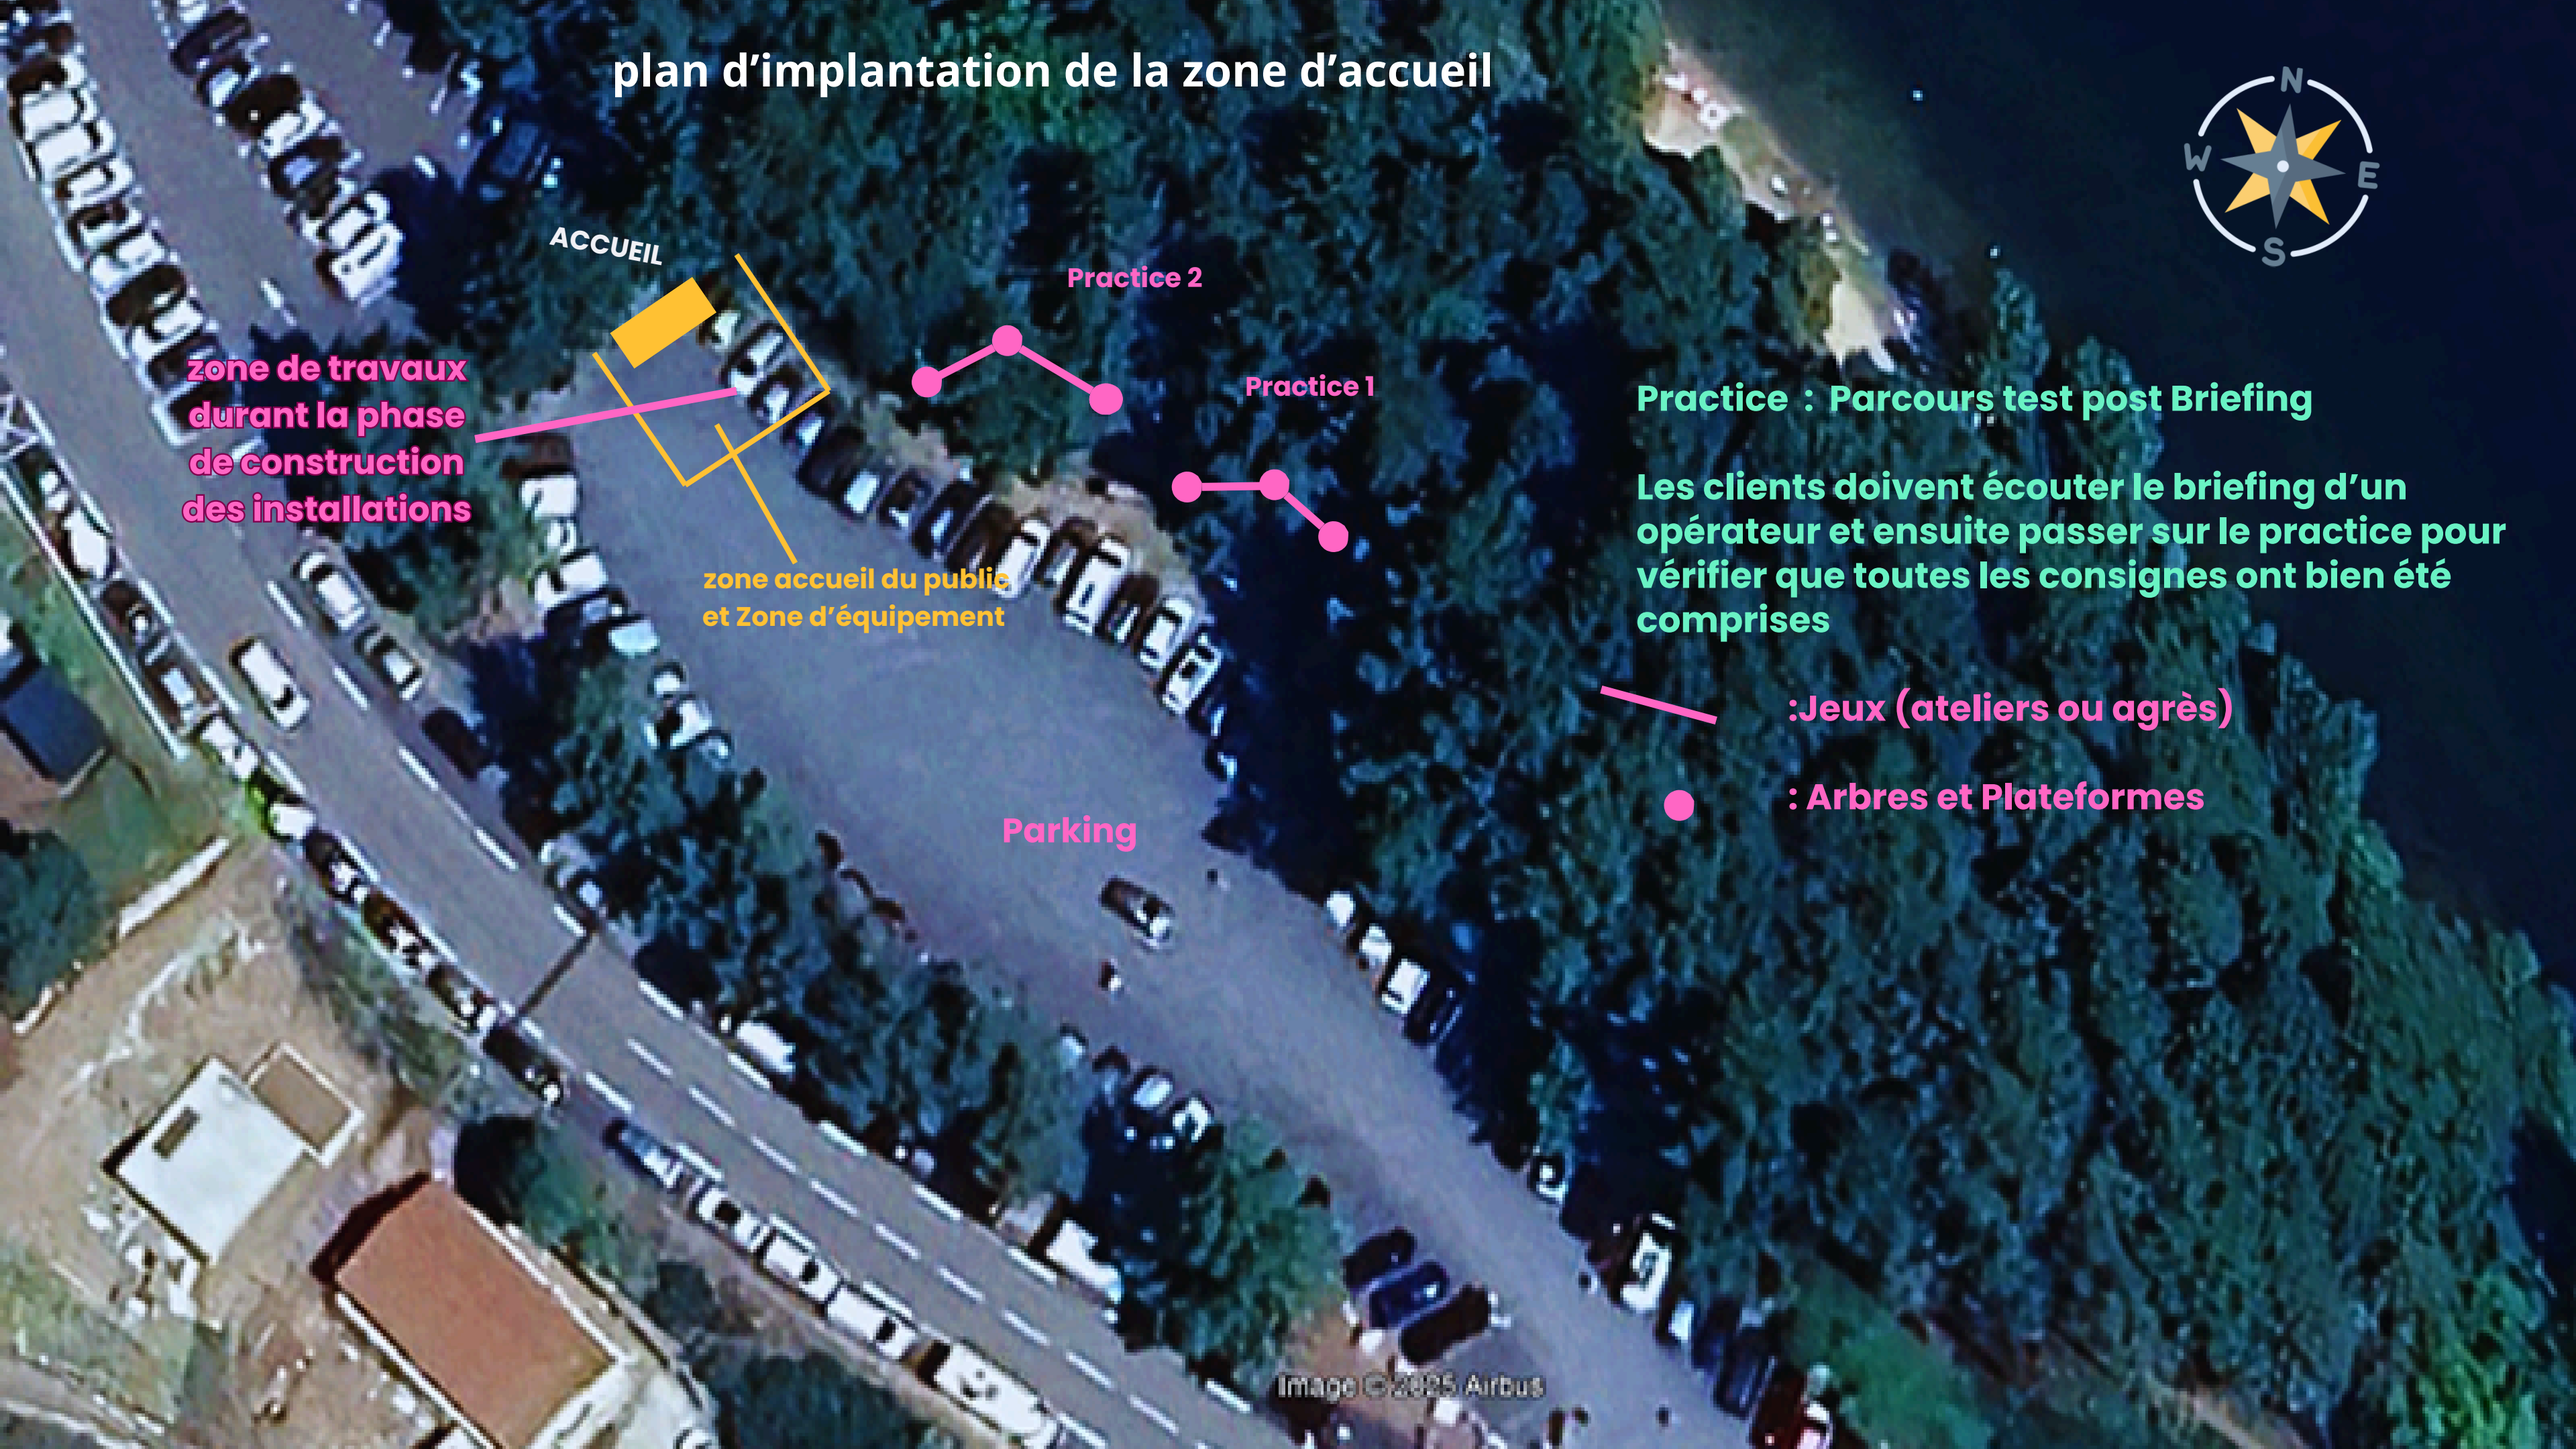

Practice : Parcours test post Briefing


Les clients doivent écouter le briefing d’un opérateur et ensuite passer sur le practice pour vérifier que toutes les consignes ont bien été comprises

:Jeux (ateliers ou agrès)

: Arbres et Plateformes

Accès et Circulation sur le site et Plan d’Évacuation

- Accès principal depuis le parking existant du lac
- Cheminement piéton sécurisé vers la zone d’accueil
- Signalétique discrète en bois naturel
- Interdiction des véhicules motorisés dans la zone forestière
- Le point de rendez-vous en cas d’évacuation se situe à l’accueil

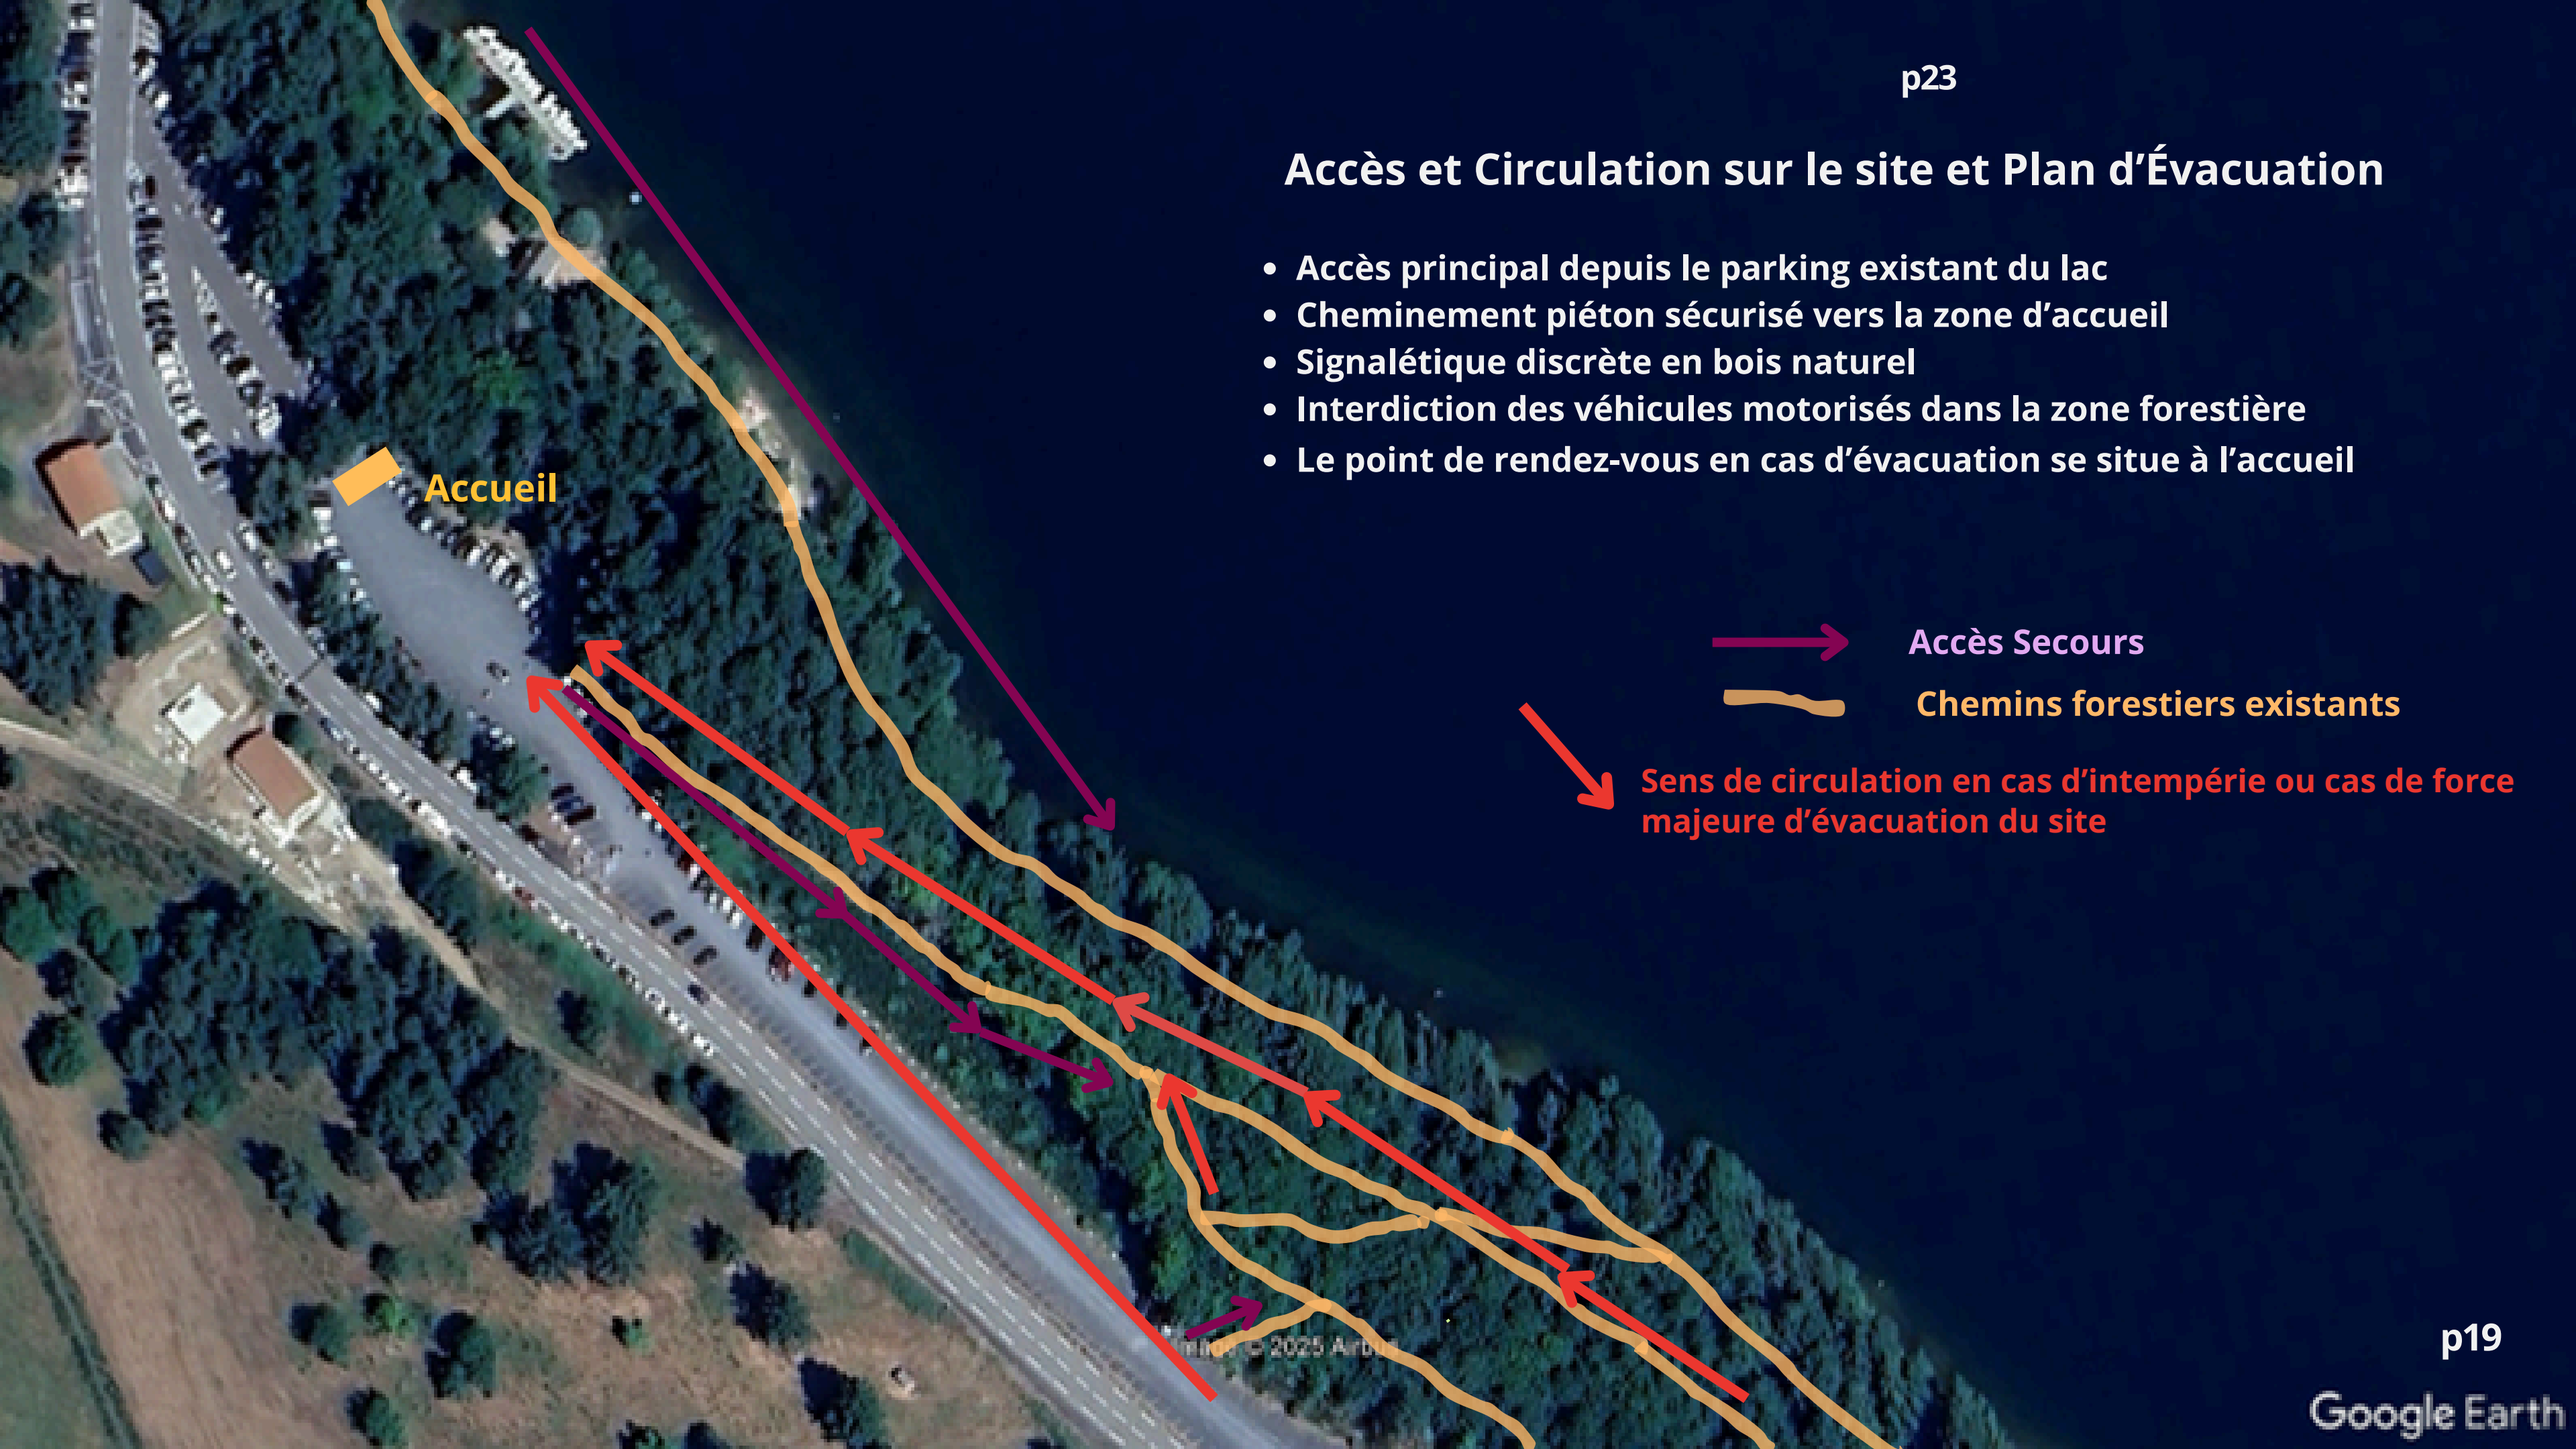

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

6.2 Interventions de Maintenance et d'Entretien

- En Phase d'Exploitation, les Arbres supports et les installations font l'objet d'un suivi régulier. Les contrôles portent sur l'état sanitaire des arbres, leur comportement mécanique et l'évolution des équipements.

- Un Contrôle Annuel est réalisé par l'Expert Arboricole afin d'évaluer l'état des arbres supports et d'anticiper les ajustements nécessaires.

- Des interventions ponctuelles peuvent être mises en œuvre si besoin (élagage ciblé, déplacement d'un atelier, retrait d'un élément).
  Elles visent à garantir la sécurité des pratiquants et le bon état des arbres supports.

- Les opérations de maintenance sont planifiées et réalisées à pied afin de limiter les interventions en milieu forestier.
- Les opérations de maintenances sont uniquement mécaniques sans l'utilisation de produit phytosanitaire comme durant la phase des travaux.

- Les interventions susceptibles de générer du bruit sont réalisées en journée, conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités retenues pour la phase de travaux.

- Si nécessaire, le porteur de projet sollicitera l'avis du Bureau d'Étude Environnemental afin de s'assurer que les opérations de maintenance ne génèrent pas de dérangement pour la Faune, notamment les Chiroptères.

7. Présence Humaine, Sensibilisation et Surveillance du Site

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

L'exploitation du parc accrobranche implique une présence humaine régulière et encadrée pendant les périodes d'ouverture.

Cette présence contribue à structurer les usages, orienter les circulations et encadrer les pratiques en milieu forestier.

- **Les pratiquants sont informés dès leur arrivée des règles de fonctionnement du Parc et des comportements attendus en milieu naturel. Des supports de sensibilisation rappellent les principes de respect du site, notamment pour les déplacements et la gestion des déchets.**

- **La présence quotidienne de personnel assure également une surveillance du secteur, notamment aux abords des cheminements et des zones de stationnement.**
  Elle contribue à limiter les incivilités (abandons de déchets, usages inadaptés).

L'organisation des flux et la lisibilité des zones accessibles améliorent la cohabitation entre les usages existants et l'activité du parc, sans extension des secteurs fréquentés.

8. Démarche volontaire d'accompagnement et actions de sensibilisation

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

8.1 Suivi des chiroptères et mise en place de gîtes

Les Habitats Forestiers présents sur le site peuvent constituer des zones favorables à certaines espèces de Chiroptères, notamment pour des fonctions de transit ou d'alimentation. (cf. Evaluation d'incidences Natura 2000)

Dans ce cadre, il est envisagé de mettre en place des gîtes à Chiroptères en Bois, implantés de manière ciblée en périphérie des zones d'activité, dans des secteurs calmes et peu fréquentés.

Ces dispositifs auront pour objectif d'offrir des zones de repos potentielles, sans interférer avec le fonctionnement du Parc. Leur implantations et leur suivi pourront être définis en cohérence avec les recommandations issues de l'Expertise Écologique et en lien avec les Acteurs compétents du territoire.

8.2 Mise en place de nichoirs pour l'avifaune forestière

Dans le même esprit, des nichoirs adaptés à différentes espèces forestières communes (mésanges, grimpereaux des bois, pinsons) pourront être installés de manière ponctuelle sur le site ou en lisière des zones d'activité.

Ces installations viseront à diversifier les possibilités de repos et de reproduction pour l'avifaune forestière ordinaire, *sans modification du fonctionnement naturel du milieu.*

8.3 Actions pédagogiques et lien avec le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

Le projet intègrera également une dimension pédagogique, en cohérence avec le classement du site en zone Natura 2000 et avec les objectifs portés par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche.

Des supports d'information et de sensibilisation pourront être mis en place à destination du public, abordant notamment :

- Le fonctionnement des milieux forestiers,
- La Faune et l'Avifaune emblématique du site
- Les principes de préservation des espaces naturels,
- Et le cadre Natura 2000.

Ces actions pédagogiques pourront être développées en lien avec le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et les dispositifs existants du site Natura 2000, afin de renforcer la compréhension des enjeux locaux par les usagers du parc.

Dans une démarche volontaire d'accompagnement écologique du site, le porteur de projet envisagera la mise en place d'actions complémentaires visant à renforcer la prise en compte de la biodiversité locale et à sensibiliser le public aux enjeux du site Natura 2000.

9. Réversibilité des Installations et remise en État du Site

alexandre.roussero@gmail.com
06 59 40 70 15

- **Les installations (plateformes, lignes de vie et agrès) sont conçues de manière entièrement réversible.**
- **Les systèmes de fixation par clous sont démontables et permettent une cicatrisation naturelle des arbres supports.**
- **La cabane d'accueil, constituée d'un container maritime bardé bois, est mobile et facilement démontable.**
- **Le démontage des équipements peut être réalisé sans travaux lourds, sans terrassement et sans engins de gros œuvre, uniquement à l'aide d'outils portatifs électriques, selon un principe identique à la phase de montage.**
- **Après dépose des installations, le site retrouve son état initial sans modification de son fonctionnement.**

La présente notice environnementale vise à expliciter les principes généraux d'intégration et de gestion environnementale du projet, en complément des études réglementaires réalisées, sans se substituer aux procédures d'autorisation en vigueur.
